


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

<b>Obra:</b>	IPDE23 001/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA CALLE MADERO				
<b>Ubicación:</b>	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Contrato:</b>	IPDE23 001/2024		
<b>Tipo de inversión:</b>	INGRESOS PROPIOS, DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO 2023	<b>Contratista:</b>	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
<b>Programa:</b>	SF SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN SD ALCANTARILLADO SC AGUA POTABLE	<b>Inicio Vigente:</b>	martes, 12 de marzo de 2024	<b>Días de Obra:</b>	<b>30</b>
<b>Subprograma:</b>	01, 03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	<b>Inicio Real:</b>	martes, 12 de marzo de 2024	<b>Monto Contratado:</b>	<b>\$1,548,042.81</b>
<b>Residente:</b>	ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA	<b>Fin Vigente:</b>	miércoles, 10 de abril de 2024	<b>Monto Ejercido:</b>	<b>\$1,548,042.81</b>
		<b>Fin Real:</b>	miércoles, 10 de abril de 2024		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	11/03/2024	0.00%	0.00%	50.0%
2	18/03/2024	11.03%	11.05%	50.0%
3	25/03/2024	23.41%	23.44%	50.0%
4	10/04/2024	100.00%	100.00%	64.9%
5	26/04/2024	100.00%	100.00%	64.9%
6	12/05/2024	100.00%	100.00%	100.0%

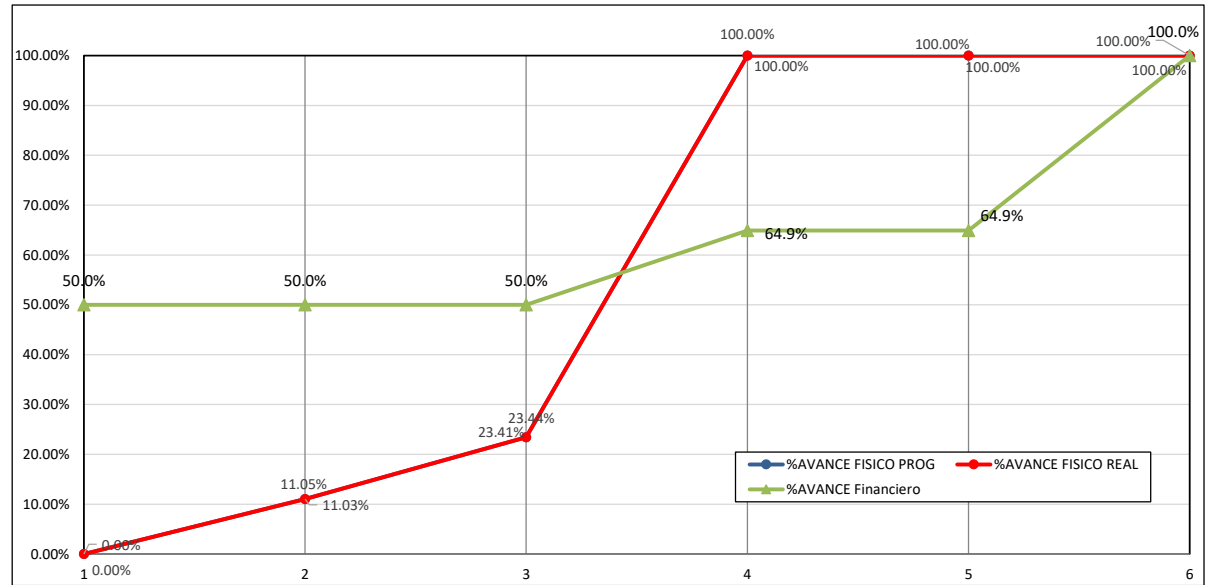

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
