


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

<b>Obra:</b>	PF 001/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE RED DE LINEA DE CONDUCCIÓN, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA				
<b>Ubicación:</b>	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Contrato:</b>	PF 001/2024		
<b>Tipo de inversión:</b>	INGRESOS PROPIOS, DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO 2023	<b>Contratista:</b>	DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V. ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		
<b>Programa:</b>	SF SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN SD ALCANTARILLADO SC AGUA POTABLE	<b>Inicio Vigente:</b>	martes, 12 de marzo de 2024	<b>Días de Obra:</b>	<b>60</b>
<b>Subprograma:</b>	01, 03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	<b>Inicio Real:</b>	martes, 12 de marzo de 2024	<b>Monto Contratado:</b>	<b>\$6,935,764.99</b>
<b>Residente:</b>	ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA	<b>Fin Vigente:</b>	viernes, 10 de mayo de 2024	<b>Monto Ejercido:</b>	
		<b>Fin Real:</b>	viernes, 10 de mayo de 2024		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	12/03/2024	0.00%	0.00%	50.0%
2	30/03/2024	14.86%	14.88%	50.0%
3	15/04/2024	60.02%	45.16%	56.0%
4	30/04/2024	90.32%	90.32%	62.9%
5	15/05/2024	100.00%	100.00%	89.0%
6	30/05/2024	100.00%	100.00%	89.0%
7	15/06/2024	100.00%	100.00%	89.0%
8	01/07/2024	100.00%	100.00%	89.0%
9	17/07/2024	100.00%	100.00%	
10	02/08/2024	100.00%	100.00%	
11	18/08/2024	100.00%	100.00%	
12	03/09/2024	100.00%	100.00%	

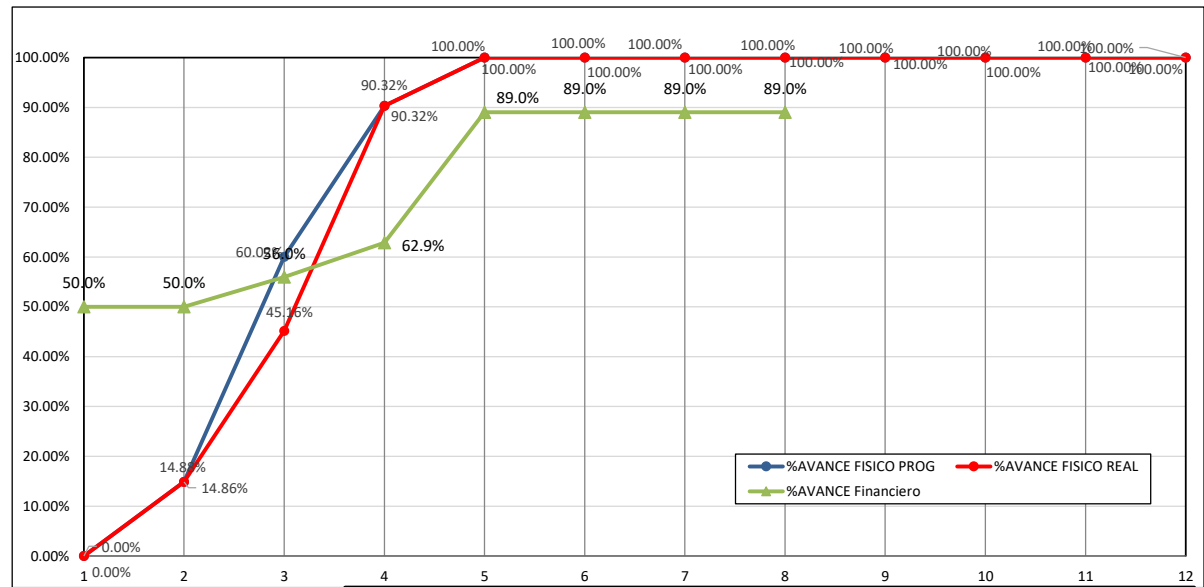

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
