

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF24 001/2024 TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 7 OBRAS Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA).;

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** PF24 001/2024

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 **Contratista:** C. JESUS ADRIAN CASTILLO SERNA


Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG. **Inicio Vigente:** sábado, 4 de mayo de 2024 **Días de Obra:** 240

Subprograma: 03 SERVICIOS **Inicio Real:** sábado, 4 de mayo de 2024 **Monto Contratado:** \$149,848.80

Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES **Fin Vigente:** domingo, 29 de diciembre de 2024 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	01/05/2024	0.00%	0.00%	0.0%
2	30/05/2024	27.09%	27.09%	0.0%
3	30/06/2024	35.18%	35.18%	0.0%
4	30/07/2024	43.27%		
5	30/08/2024	51.37%		
6	30/09/2024	59.46%		
7	30/10/2024	67.55%		
8	30/11/2024	75.65%		
9	30/12/2024	100.00%		
10	30/01/2025	100.00%		

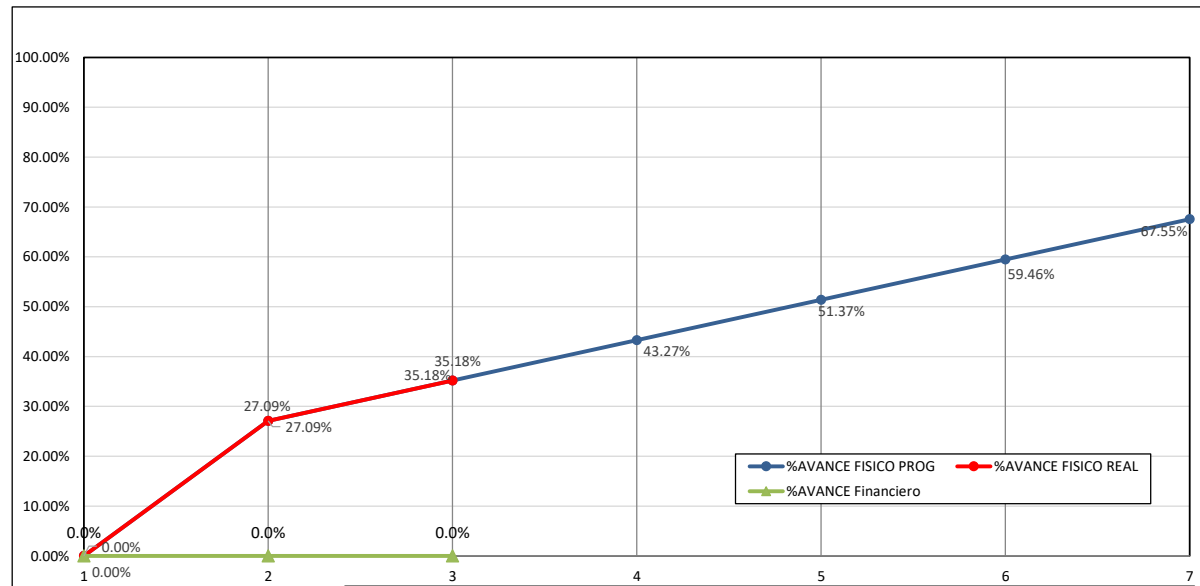

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
