


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PF24 001 A/2024 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA PROYECTO ESTRUCTURAL EJECUTIVO DE TECHUMBRE DE EXPLANADA ALFONSO ROMO DE VIVAR EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO CON DOS SONDEOS TIPO SPT A 5 mts DE PROFUNDIDAD EJECUTADO CON PERFORADORA ROTARIA. REALIZANDO PRUEBA DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR A CADA METRO Y RECUPERANDO MUESTRAS ALTERADAS CON SAN FRANCISCO DE LOS ROMO		
Ubicación:	Contrato: PF24 001 A/2024		
Tipo de inversión:	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	Contratista:	INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Inicio Vigente:	miércoles, 5 de junio de 2024 Días de Obra: 30
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	miércoles, 5 de junio de 2024 Monto Contratado: \$244,876.00
Residente:	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	Fin Vigente:	jueves, 4 de julio de 2024 Monto Ejercido:
		Fin Real:	jueves, 4 de julio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	08/06/2024	5.16%	5.16%	0.0%
2	22/06/2024	30.36%	30.36%	0.0%
3	06/07/2024	100.00%		
4	20/07/2024	100.00%		
5	03/08/2024	100.00%		
6	17/08/2024	100.00%		
7	31/08/2024	100.00%		

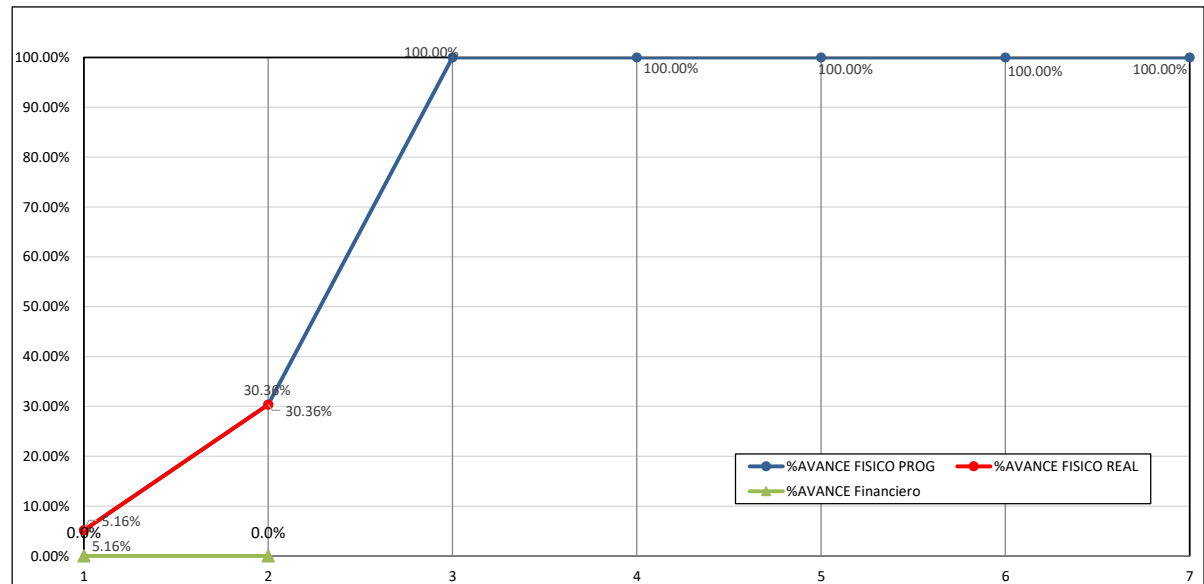

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
