

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF24 002/2024 CONSTRUCCIÓN DE DUGOUT S PARA CAMPOS DE BIESBOL

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: PF24 002/2024

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024

Contratista: ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Programa: SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Inicio Vigente: martes, 28 de mayo de 2024

Días de Obra: 45

Subprograma: 02 CONSTRUCCIÓN

Inicio Real: martes, 28 de mayo de 2024

Monto Contratado: \$839,328.16


Residente: ARQ. FRANCISCO LOZANO SILVA

Fin Vigente: jueves, 11 de julio de 2024

Monto Ejercido:

Fin Real: jueves, 11 de julio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	28/05/2024	1.92%	1.94%	50.0%
2	15/06/2024	52.27%	52.29%	50.0%
3	01/07/2024	77.49%	77.50%	50.0%
4	16/07/2024	100.00%		
5	30/07/2024	100.00%		
6	14/08/2024	100.00%		
7	30/08/2024	100.00%		

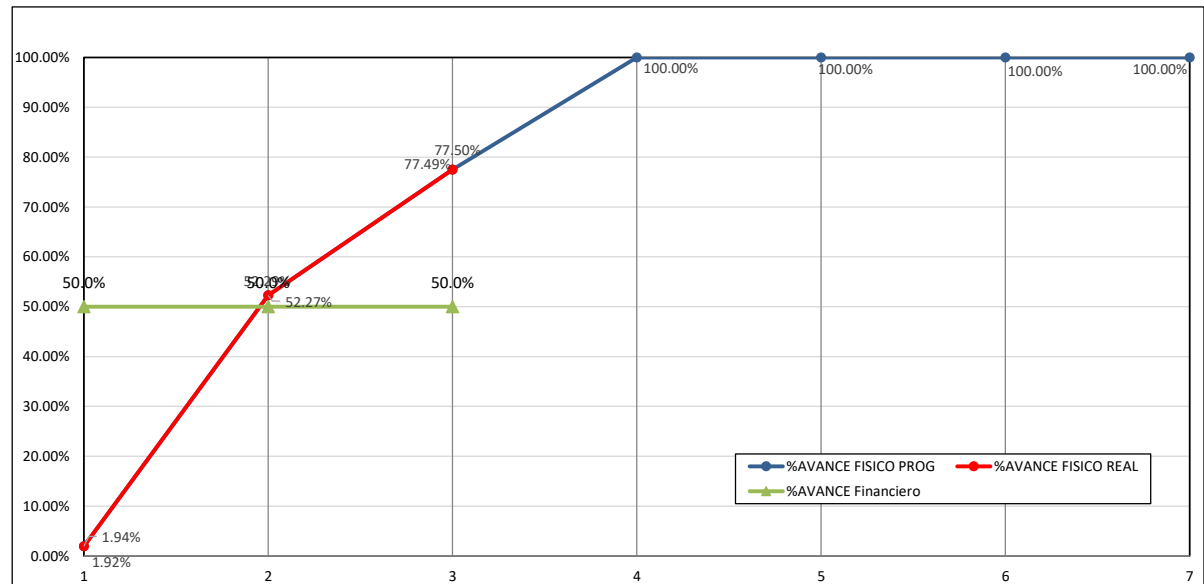

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
