


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF24 003/2024 CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE TAXIS EN CALLE JOSÉ DE ANDA GUTIÉRREZ ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. MÉXICO

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024
Programa: DA EDIFICIOS PÚBLICOS
Subprograma: 03 CONSTRUCCIÓN
Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Contrato: PF24 003/2024
Contratista: ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Inicio Vigente: martes, 28 de mayo de 2024
Días de Obra: 30
Inicio Real: martes, 28 de mayo de 2024
Monto Contratado: \$609,473.51
Fin Vigente: miércoles, 26 de junio de 2024
Monto Ejercido:
Fin Real: miércoles, 26 de junio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/06/2024	5.27%	5.28%	50.0%
2	11/06/2024	30.20%	30.22%	50.0%
3	18/06/2024	52.20%	52.24%	50.0%
4	25/06/2024	98.88%	98.90%	50.0%
5	02/07/2024	100.00%		
6	09/07/2024	100.00%		
7	16/07/2024	100.00%		

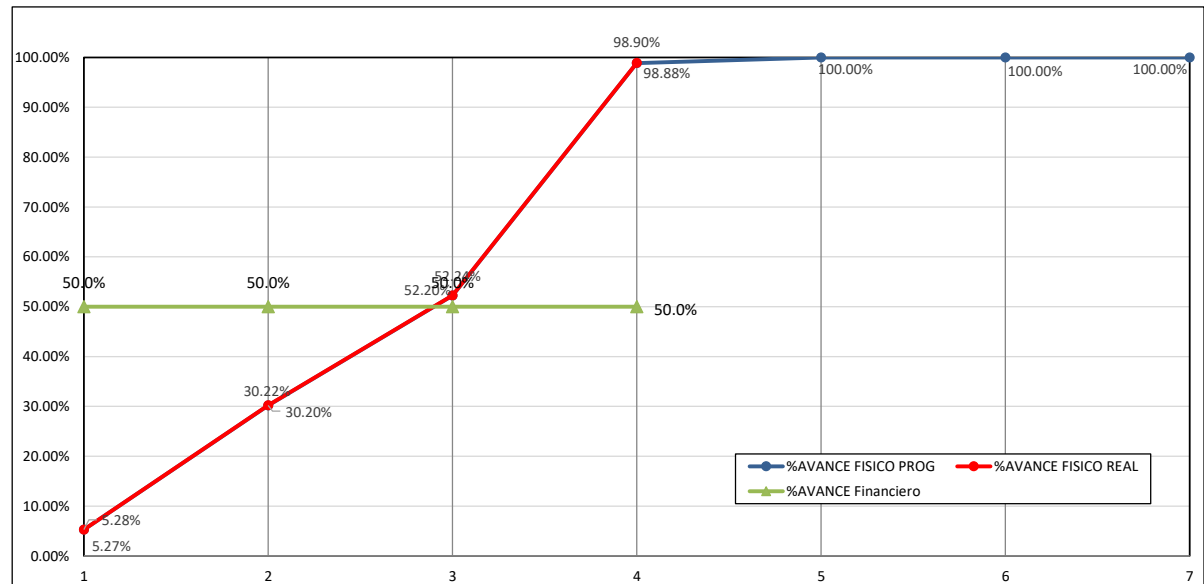

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
