

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PFFR 001 PPIP23 001/2024 RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA Y DESCARGAS SANITARIAS CALLE INDEPENDENCIA PTE, COL CENTRO

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE INDEPENDENCIA PTE. A CALLE MATAMOROS.

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: PFFR 001 PPIP23 001/2024

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024
FONDO RESARCITORIO 2024
PARTICIPACIONES FEDERALES, DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO 2023

Contratista: JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V
ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V

Programa: INGRESOS PROPIOS, DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO 2023
SF,SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN
SD ALCANTARILLADO
SC AGUA POTABLE

Inicio Vigente: lunes, 6 de mayo de 2024

Días de Obra: 90

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN
03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

Inicio Real: lunes, 6 de mayo de 2024

Monto Contratado: \$13,229,571.54


Residente: ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA

Fin Vigente: sábado, 3 de agosto de 2024

Monto Ejercido:

Fin Real: sábado, 3 de agosto de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	06/05/2024	1.41%	1.43%	50.0%
2	24/05/2024	12.91%	12.92%	50.0%
3	09/06/2024	27.01%	27.04%	50.0%
4	24/06/2024	52.81%	52.83%	50.0%
5	08/07/2024	67.06%	67.09%	
6	23/07/2024	89.11%	89.15%	
7	08/08/2024	100.00%	100.00%	

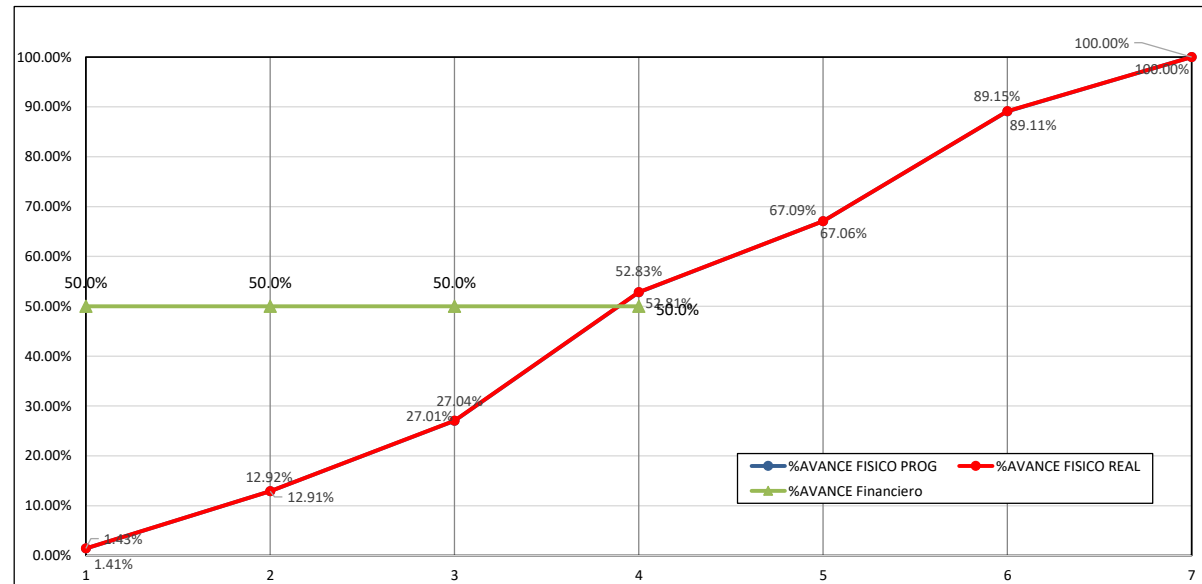

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
