

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 007/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LEONA VICARIO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE EMILIANO ZAPATA

**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** FAISMUN 007/2024

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 **Contratista:** GCVICA, S.A. DE C.V.


**Programa:** SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES SE URBANIZACIÓN SD ALCANTARILLADO **Inicio Vigente:** jueves, 16 de mayo de 2024 **Días de Obra:** 30

**Subprograma:** 01,02,03 REHABILITACIÓN, ASFALTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS **Inicio Real:** jueves, 16 de mayo de 2024 **Monto Contratado:** \$869,027.20

**Residente:** ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** viernes, 14 de junio de 2024 **Monto Ejercido:**

**Fin Real:** viernes, 14 de junio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	16/05/2024	0.21%	0.23%	50.0%
2	23/05/2024	14.38%	14.40%	50.0%
3	30/05/2024	53.69%	53.71%	50.0%
4	06/06/2024	68.27%	68.29%	66.2%
5	13/06/2024	98.13%	98.16%	66.2%
6	20/06/2024	100.00%	100.00%	77.7%
7	27/06/2024	100.00%	100.00%	77.7%
8	04/07/2024	100.00%		
9	11/07/2024	100.00%		

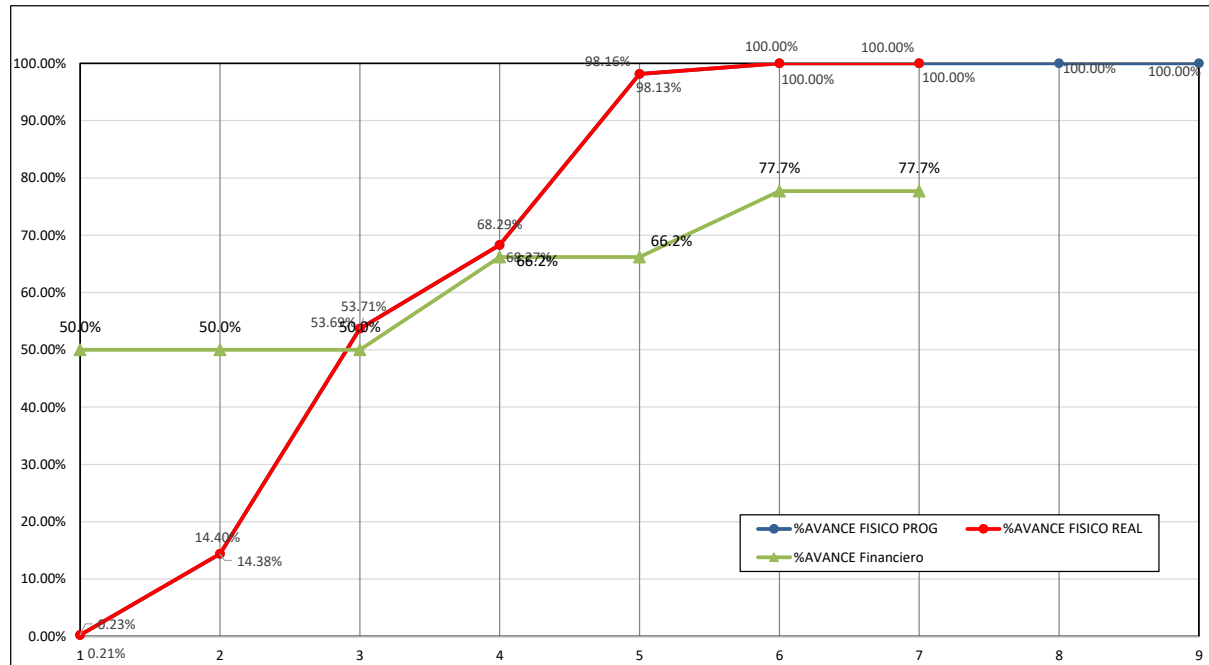

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
