

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 009/2024 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VIÑEDOS MARQUITOS DE AV. CONSTITUCION A CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** FAISMUN 009/2024

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 **Contratista:** URDAZ SUPERVISIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.


Programa: SF,SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN **Inicio Vigente:** jueves, 16 de mayo de 2024 **Días de Obra:** 30

Subprograma: 01,03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS **Inicio Real:** jueves, 16 de mayo de 2024 **Monto Contratado:** \$2,161,838.84

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** viernes, 14 de junio de 2024 **Monto Ejercido:**

Fin Real: viernes, 14 de junio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	16/05/2024	57.50%	57.51%	50.0%
2	31/05/2024	99.95%	99.97%	64.9%
3	30/06/2024	100.00%	100.00%	64.9%
4	30/07/2024	100.00%		
5	29/08/2024	100.00%		
6	28/09/2024	100.00%		
7	28/10/2024	100.00%		
8	27/11/2024	100.00%		
9	27/12/2024	100.00%		

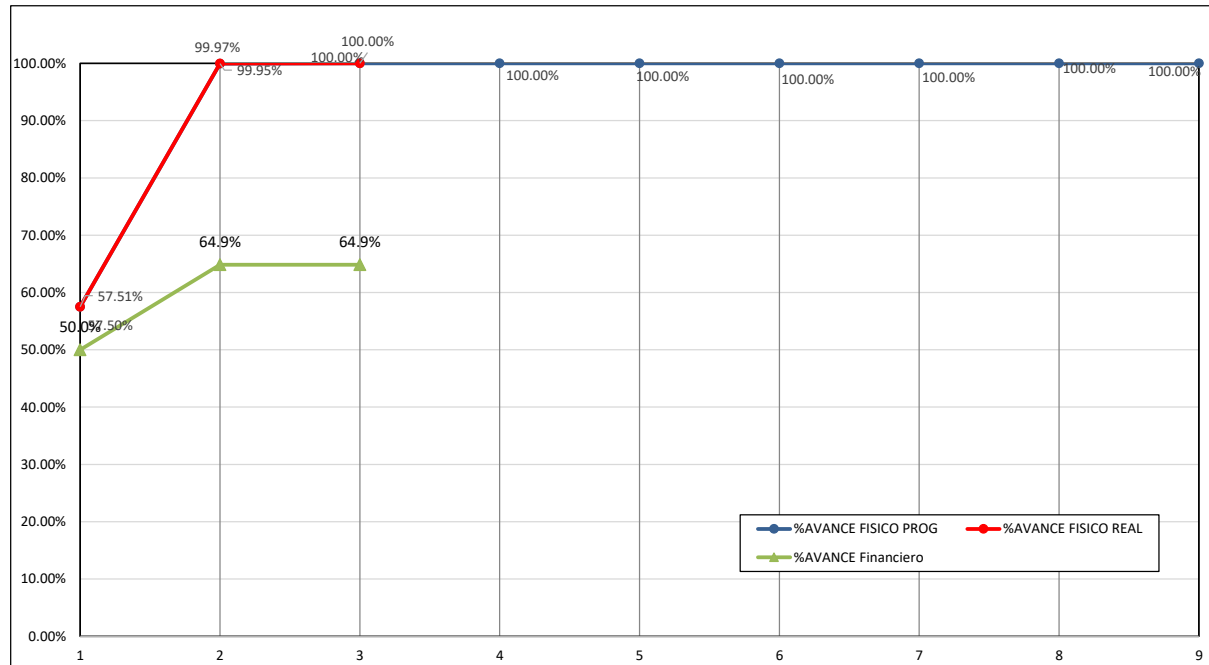

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
