

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 010 011/2024 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUIS ECHEVERRIA DE LIMITE NORTE DEL ARROLLO A CALLE JOSE NIEVES ORNELAS SALCEDO

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE NIEVES ORNELAS SALCEDO DE CALLE LUIS ECHEVERRIA A CALLE VENUSTIANO CARRANZA NORTE

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** FAISMUN 010 011/2024

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 **Contratista:** BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.,


Programa: SE URBANIZACIÓN **Inicio Vigente:** viernes, 19 de abril de 2024 **Días de Obra:** 60

Subprograma: 03,03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS **Inicio Real:** viernes, 19 de abril de 2024 **Monto Contratado:** \$2,023,801.02

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** lunes, 17 de junio de 2024 **Monto Ejercido:**

Fin Real: lunes, 17 de junio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/04/2024	0.02%	0.05%	50.0%
2	30/04/2024	2.94%	2.96%	50.0%
3	30/05/2024	36.31%	36.33%	52.8%
4	29/06/2024	100.00%	100.00%	54.4%
5	29/07/2024	100.00%	100.00%	54.4%
6	28/08/2024	100.00%	100.00%	
7	27/09/2024	100.00%	100.00%	
8	27/10/2024	100.00%	100.00%	
9	26/11/2024	100.00%	100.00%	

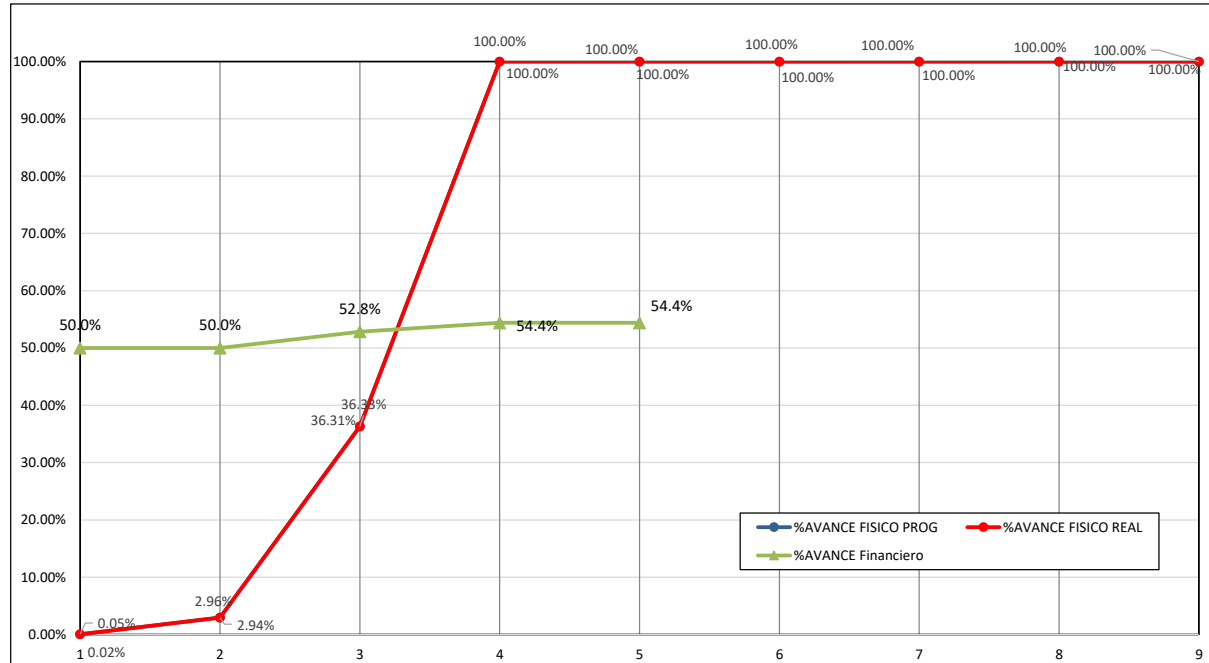

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
