

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 015/2024 REHABILITACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS, REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** FAISMUN 015/2024

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 **Contratista:** CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.,

Programa: SF,SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN **Inicio Vigente:** viernes, 7 de junio de 2024 **Días de Obra:** 60

SD ALCANTARILLADO


Subprograma: 01,03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS **Inicio Real:** viernes, 7 de junio de 2024 **Monto Contratado:** \$1,916,538.64

SC AGUA POTABLE

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** lunes, 5 de agosto de 2024 **Monto Ejercido:**

Fin Real: lunes, 5 de agosto de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	07/06/2024	0.00%	0.02%	50.0%
2	30/06/2024	24.33%	24.35%	50.0%
3	30/07/2024	96.03%		
4	29/08/2024	100.00%		
5	28/09/2024	100.00%		
6	28/10/2024	100.00%		
7	27/11/2024	100.00%		
8	27/12/2024	100.00%		
9	26/01/2025	100.00%		

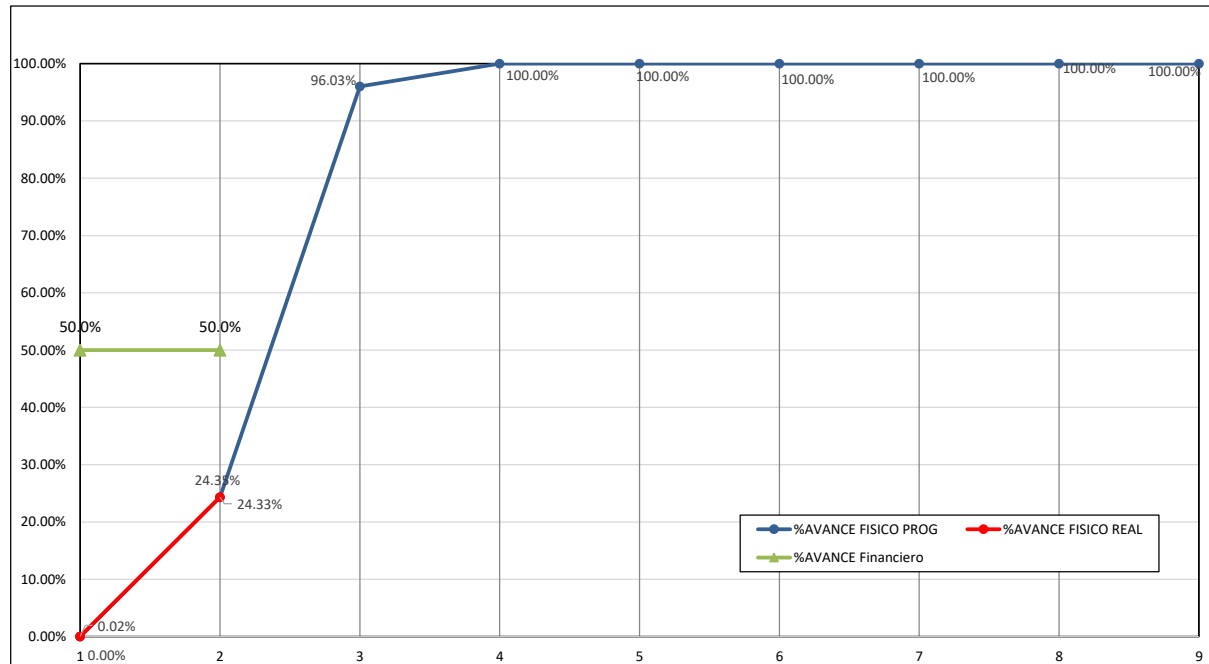

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
