

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 016/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE CANDILES TRAMO CALLE POZO NUEVO A CALLE PONIENTE Y DE CALLE PONIENTE A MITAD DEL TRAMO DE LA CALLE PONIENTE A CALLE SAN MARTÍN , REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CANDILES TRAMO CALLE POZO NUEVO A CALLE PONIENTE Y DE CALLE PONIENTE A MITAD DEL TRAMO DE LA CALLE PONIENTE A CALLE SAN MARTÍN.

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** FAISMUN 016/2024

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 **Contratista:** LEOPOLDO MORONES FONSECA


Programa: SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO **Inicio Vigente:** miércoles, 5 de junio de 2024 **Días de Obra:** 30

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN **Inicio Real:** miércoles, 5 de junio de 2024 **Monto Contratado:** \$1,008,136.41

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** jueves, 4 de julio de 2024 **Monto Ejercido:**

Fin Real: jueves, 4 de julio de 2024

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 05/06/2024 | 0.00% | 0.03% | 50.0% |
| 2 | 12/06/2024 | 7.56% | 7.59% | 50.0% |
| 3 | 19/06/2024 | 30.16% | 30.17% | 50.0% |
| 4 | 26/06/2024 | 61.89% | 61.92% | 50.0% |
| 5 | 03/07/2024 | 94.05% | | |
| 6 | 10/07/2024 | 100.00% | | |
| 7 | 17/07/2024 | 100.00% | | |
| 8 | 24/07/2024 | 100.00% | | |
| 9 | 31/07/2024 | 100.00% | | |

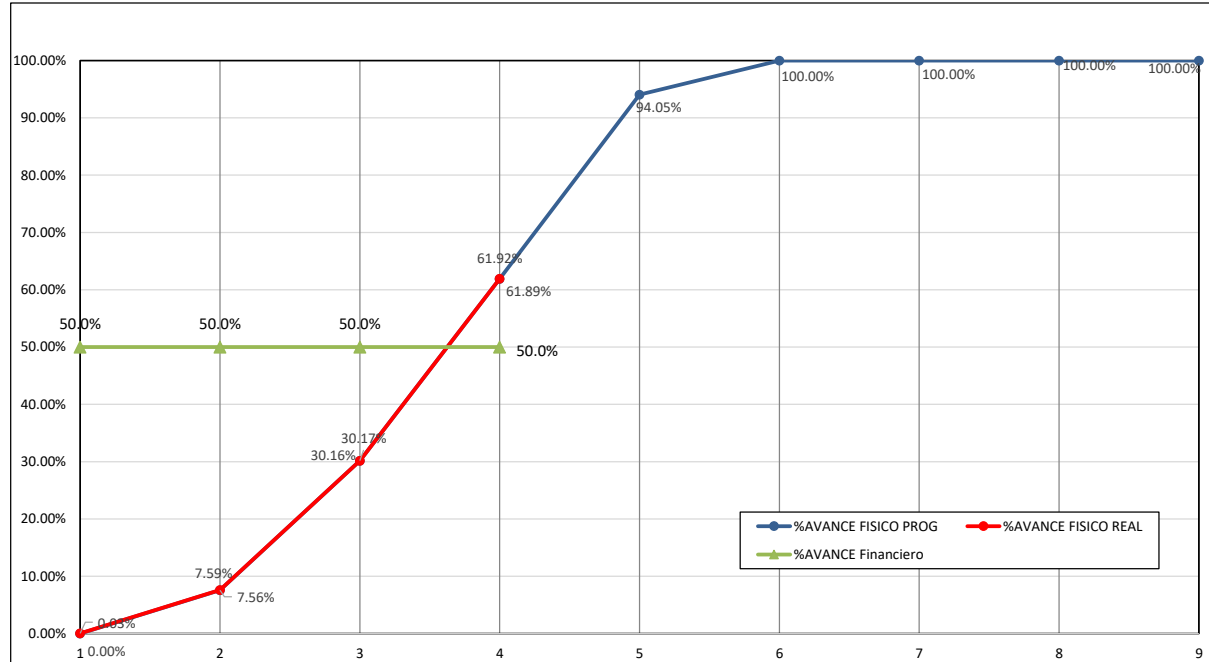

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
