


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IEA PMSFR 002/2024 REHABILITACIÓN DE BAÑOS, CAMBIO DE LUMINARIAS Y PUERTA DE ACCESO TELESECUNDARIA ETV NUM. 84 ABRAHAM LINCOLN
Ubicación: EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES **Contrato:** IEA PMSFR 002/2024
Tipo de inversión: CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APOYO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA **Contratista:** JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,
Programa: **Inicio Vigente:** viernes, 16 de febrero de 2024 **Días de Obra:** 30 días
Subprograma: 01 RECONSTRUCCIÓN b) PRIMARIA **Inicio Real:** viernes, 16 de febrero de 2024 **Monto Contratado:** \$ 490,298.79
Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES **Fin Vigente:** sábado, 16 de marzo de 2024 **Monto Ejercido:** \$ 490,298.79
Fin Real: martes, 12 de marzo de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/02/2024	0.00%	0.00%	49.6%
2	22/02/2024	9.60%	11.52%	49.6%
3	29/02/2024	21.73%	26.07%	49.6%
4	07/03/2024	66.95%	80.34%	76.6%
5	14/03/2024	94.73%	100.00%	76.6%
6	21/03/2024	100.00%	100.00%	100.0%

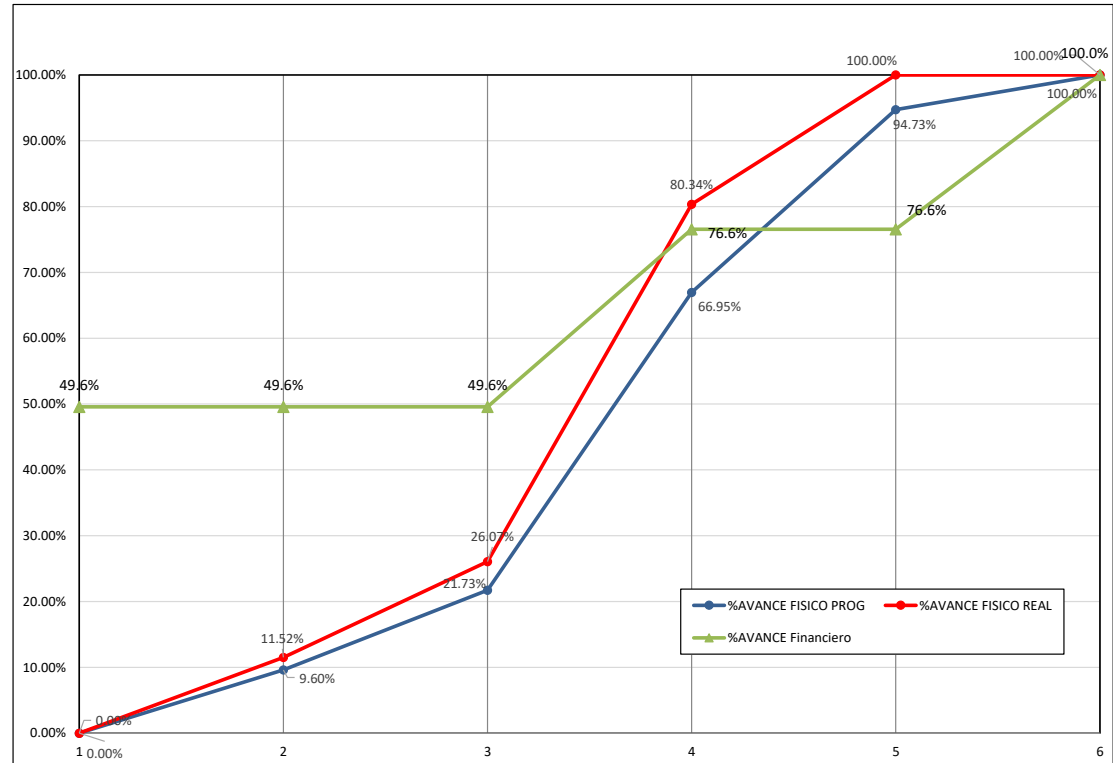

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
