


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** IEA PMSFR 003/2024 CERCO PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE PRIMARIA GENERAL VICENTA TRUJILLO  
**Ubicación:** PUERTECITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, **Contrato:** IEA PMSFR 003/2024  
**Tipo de inversión:** CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APOYO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA **Contratista:** ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
**Programa:** **Inicio Vigente:** viernes, 16 de febrero de 2024 **Días de Obra:** 30 días  
**Subprograma:** 01 RECONSTRUCCIÓN b) PRIMARIA **Inicio Real:** viernes, 16 de febrero de 2024 **Monto Contratado:** \$ 925,129.41  
 02 CONSTRUCCIÓN b) PRIMARIA  
**Residente:** ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES **Fin Vigente:** sábado, 16 de marzo de 2024 **Monto Ejercido:** \$ 925,129.41  
**Fin Real:** martes, 12 de marzo de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/02/2024	0.00%	0.00%	49.5%
2	22/02/2024	10.74%	12.88%	49.5%
3	29/02/2024	49.98%	59.97%	49.5%
4	07/03/2024	82.10%	98.52%	92.4%
5	14/03/2024	97.13%	100.00%	99.1%
6	21/03/2024	100.00%	100.00%	100.0%

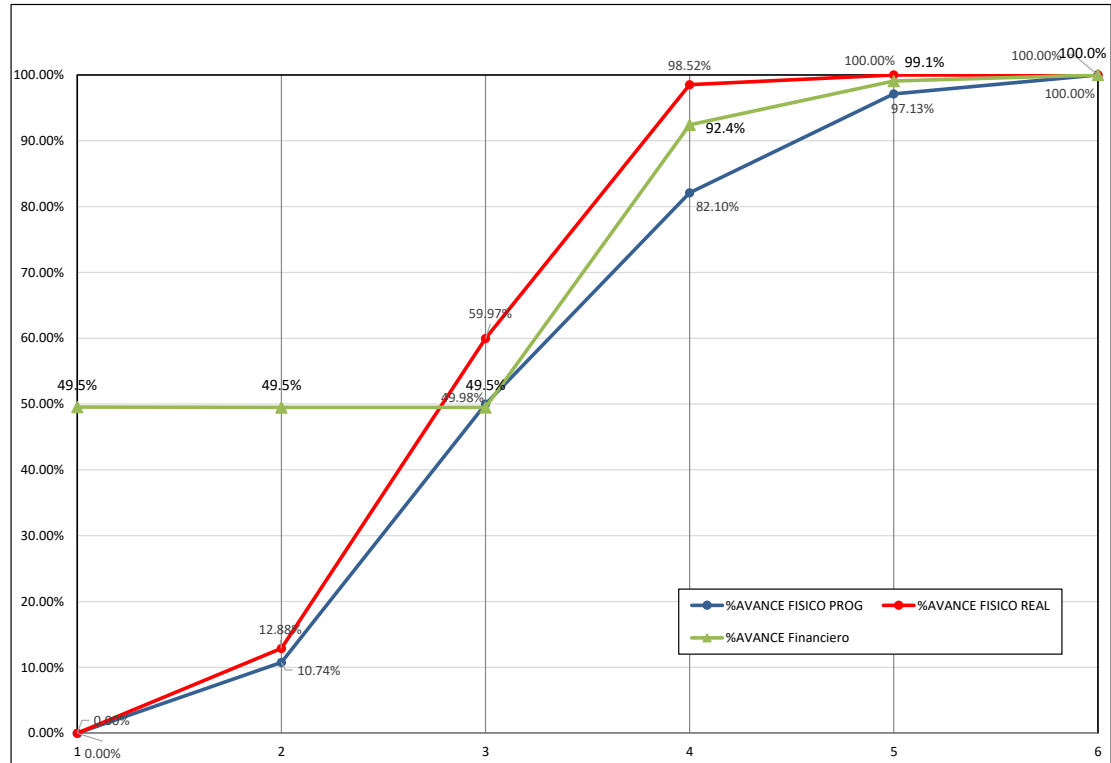

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
