


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	IP 001 B/2024 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 18 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA)				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	IP 001 B/2024		
Tipo de inversión:	IP INGRESOS PROPIOS 2024	Contratista:	INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.,		
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Inicio Vigente:	sábado, 27 de enero de 2024	Días de Obra:	30
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	sábado, 27 de enero de 2024	Monto Contratado:	\$63,735.55
Residente:	ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA	Fin Vigente:	domingo, 25 de febrero de 2024	Monto Ejercido:	\$63,735.55
		Fin Real:	domingo, 25 de febrero de 2024		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/01/2024	4.55%	4.55%	0.0%
2	06/02/2024	51.67%	51.67%	0.0%
3	13/02/2024	70.00%	70.00%	0.0%
4	20/02/2024	85.00%	85.00%	0.0%
5	27/02/2024	100.00%	100.00%	0.0%
6	05/03/2024	100.00%	100.00%	100.0%

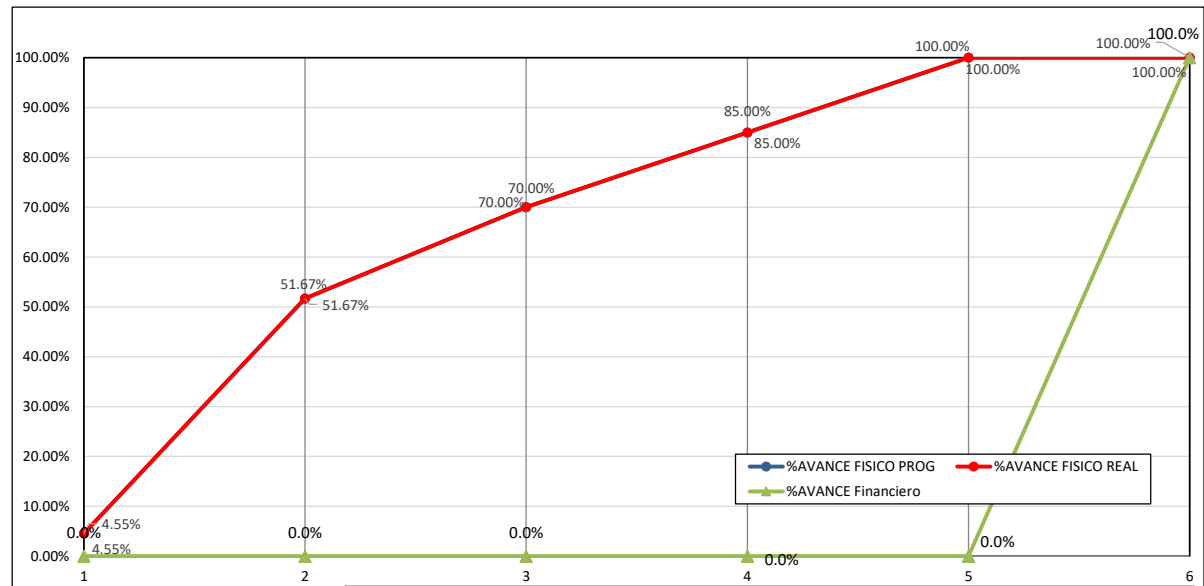

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
