

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** IP 002/2024 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL "JARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA VEGA"

**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Contrato:** IP 002/2024

**Tipo de inversión:** IP INGRESOS PROPIOS 2024

**Contratista:** O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.

**Programa:** DA EDIFICIOS PÚBLICOS

**Inicio Vigente:** sábado, 24 de agosto de 2024

**Días de Obra:** 60

**Subprograma:** 03 CONSTRUCCIÓN

**Inicio Real:** sábado, 24 de agosto de 2024

**Monto Contratado:** \$750,418.26


**Residente:** ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

**Fin Vigente:** martes, 22 de octubre de 2024

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:** martes, 22 de octubre de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/08/2024	0.40%	0.41%	50.0%
2	07/09/2024	6.31%	6.33%	50.0%
3	14/09/2024	19.90%	19.92%	50.0%
4	21/09/2024	27.47%	27.48%	50.0%
5	28/09/2024	35.84%		
6	05/10/2024	45.51%		
7	12/10/2024	58.48%		
8	19/10/2024	81.16%		
9	26/10/2024	100.00%		
10	02/11/2024	100.00%		

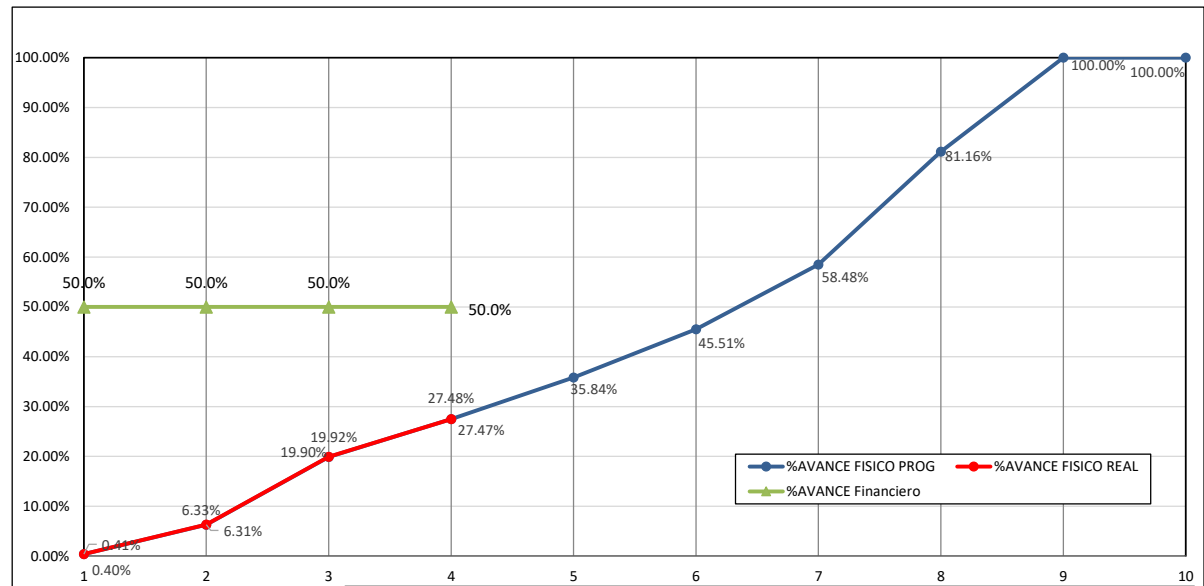

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
