

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** IP 003/2024 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN EL ACCESO SUR DE LA COMUNIDAD DE LORETITO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Ubicación:** LORETITO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Tipo de inversión:** IP INGRESOS PROPIOS 2024

**Programa:** SE URBANIZACIÓN

**Subprograma:** 04 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y JARDINES

**Residente:** ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

**Contrato:** IP 003/2024

**Contratista:** ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,

**Inicio Vigente:** lunes, 9 de septiembre de 2024

**Días de Obra:** 30

**Inicio Real:** lunes, 9 de septiembre de 2024


**Monto Contratado:** \$831,802.68

**Fin Vigente:** martes, 8 de octubre de 2024

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:** martes, 8 de octubre de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	14/09/2024	1.10%	1.11%	0.0%
2	21/09/2024	14.17%	14.19%	0.0%
3	28/09/2024	40.60%		
4	05/10/2024	69.18%		
5	12/10/2024	100.00%		
6	19/10/2024	100.00%		
	26/10/2024	100.00%		
	02/11/2024	100.00%		
	09/11/2024	100.00%		
	16/11/2024	100.00%		

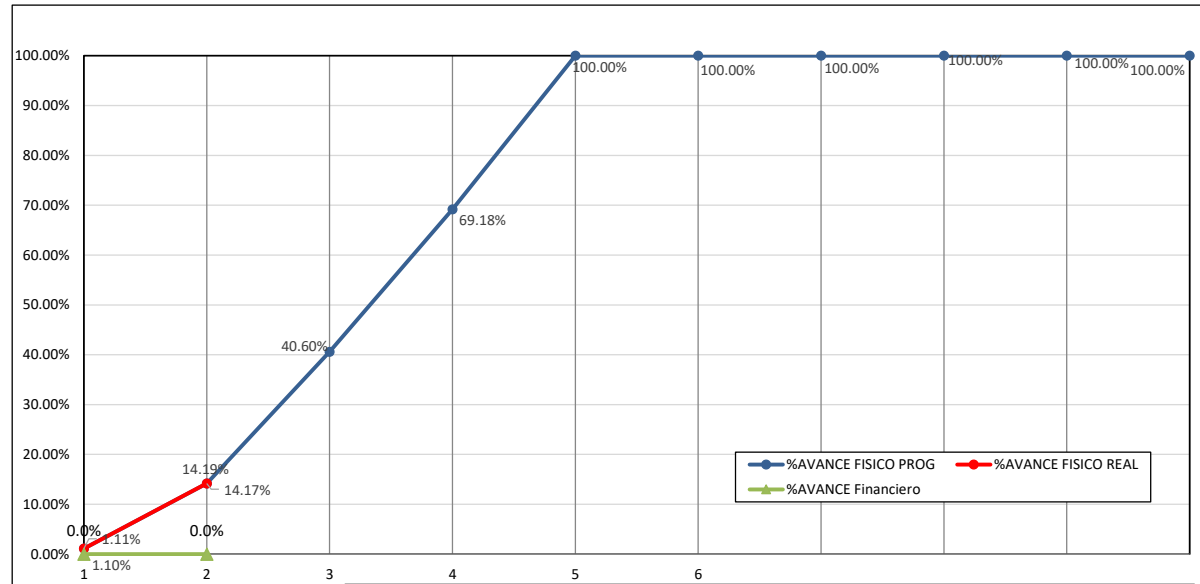

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
