


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 002/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA CALLE EMILIO CARRANZA
Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** PF 002/2024
Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS, DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO 2023 **Contratista:** EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.,
Programa: SF SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN SD ALCANTARILLADO SC AGUA POTABLE **Inicio Vigente:** martes, 12 de marzo de 2024 **Días de Obra:** 30
Subprograma: 01, 03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS **Inicio Real:** martes, 12 de marzo de 2024 **Monto Contratado:** \$1,412,198.19
Residente: ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA **Fin Vigente:** miércoles, 10 de abril de 2024 **Monto Ejercido:** \$1,412,198.19
Fin Real: miércoles, 10 de abril de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	12/03/2024	0.00%	0.00%	50.0%
2	30/03/2024	47.20%	47.25%	50.0%
3	15/04/2024	100.00%	100.00%	64.4%
4	30/04/2024	100.00%	100.00%	100.0%

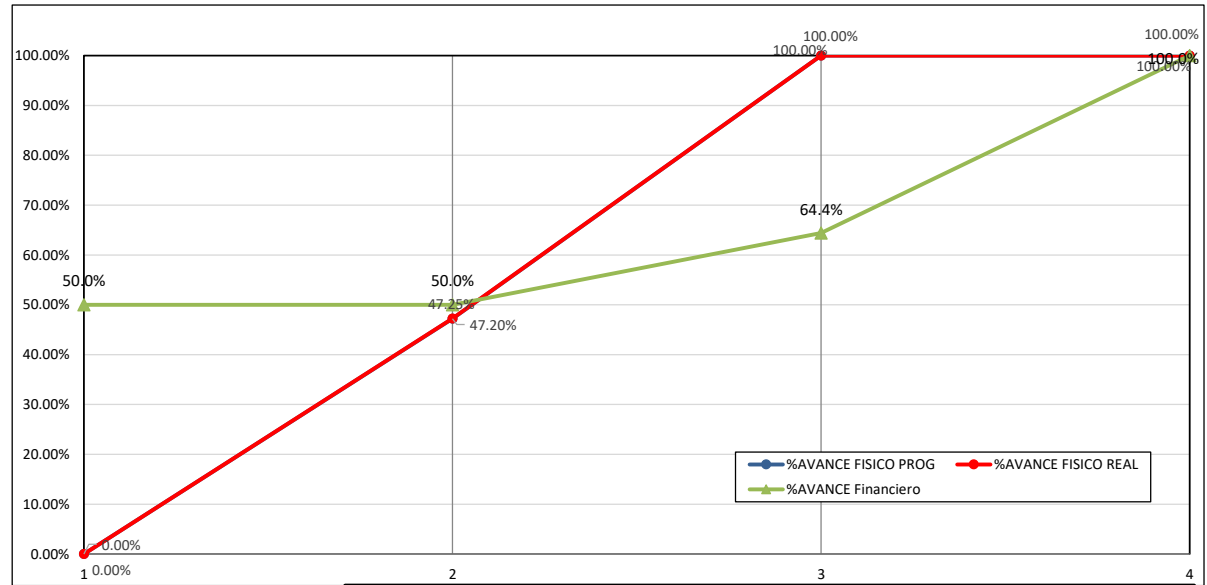

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
