

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PF24 002/2024 CONSTRUCCIÓN DE DUGOUT S PARA CAMPOS DE BIESBOL

**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Contrato:** PF24 002/2024

**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES 2024

**Contratista:** ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

**Programa:** SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

**Inicio Vigente:** martes, 28 de mayo de 2024

**Días de Obra:** 45

**Subprograma:** 02 CONSTRUCCIÓN

**Inicio Real:** martes, 28 de mayo de 2024

**Monto Contratado:** \$849,994.86


**Residente:** ARQ. FRANCISCO LOZANO SILVA

**Fin Vigente:** jueves, 11 de julio de 2024

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:** jueves, 11 de julio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	28/05/2024	1.92%	1.94%	49.4%
2	15/06/2024	52.27%	52.29%	49.4%
3	01/07/2024	77.49%	77.50%	72.8%
4	16/07/2024	100.00%	100.00%	98.2%
5	30/07/2024	100.00%	100.00%	98.2%
6	14/08/2024	100.00%	100.00%	98.2%
7	30/08/2024	100.00%	100.00%	98.2%
8	15/09/2024	100.00%	100.00%	98.2%
9	01/10/2024	100.00%	100.00%	
10	17/10/2024	100.00%	100.00%	
11	02/11/2024	100.00%	100.00%	

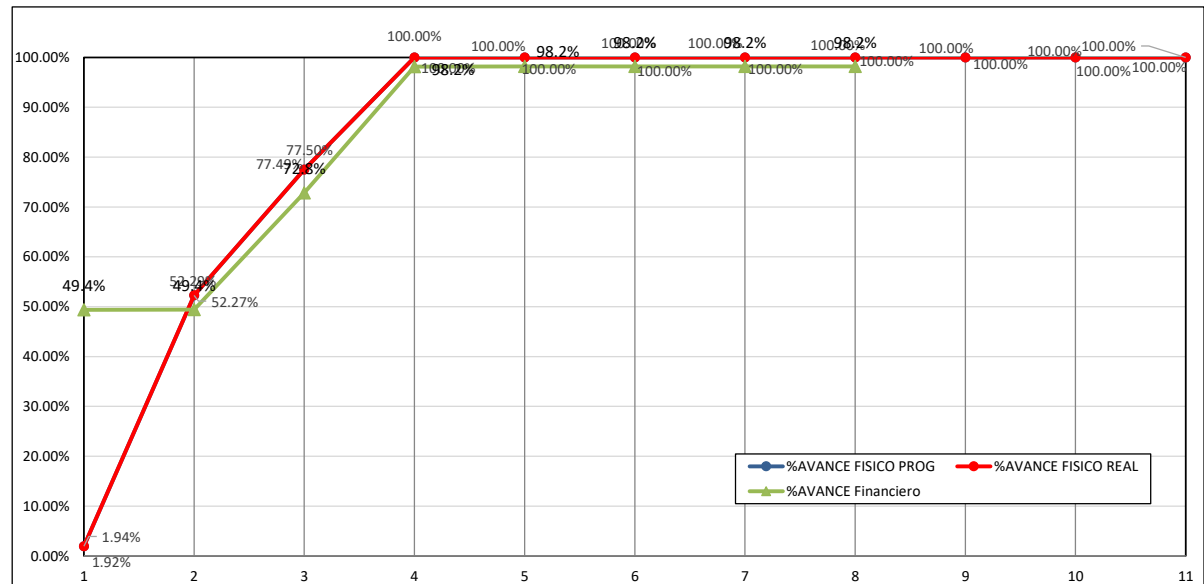

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
