

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF24 003/2024 CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE TAXIS EN CALLE JOSÉ DE ANDA GUTIÉRREZ ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. MÉXICO

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: PF24 003/2024

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024

Contratista: ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Programa: DA EDIFICIOS PÚBLICOS

Inicio Vigente: martes, 28 de mayo de 2024

Días de Obra: 30

Subprograma: 03 CONSTRUCCIÓN

Inicio Real: martes, 28 de mayo de 2024

Monto Contratado: \$609,473.51


Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Fin Vigente: miércoles, 26 de junio de 2024

Monto Ejercido:

Fin Real: miércoles, 26 de junio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/06/2024	5.27%	5.28%	47.6%
2	11/06/2024	30.20%	30.22%	47.6%
3	18/06/2024	52.20%	52.24%	76.5%
4	25/06/2024	98.88%	98.90%	76.5%
5	02/07/2024	100.00%	100.00%	95.2%
6	09/07/2024	100.00%	100.00%	
7	16/07/2024	100.00%	100.00%	

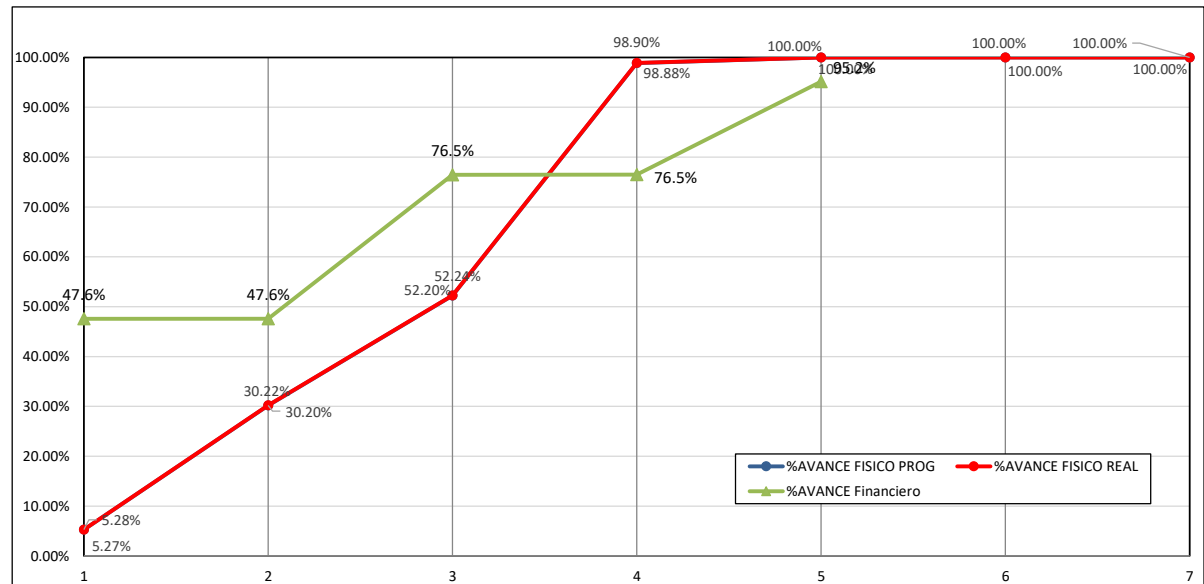

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
