


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PF24 004/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA EN LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN NORTE  
**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** PF24 004/2024  
**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 **Contratista:** MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.  
**Programa:** SF,SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN SD ALCANTARILLADO SC AGUA POTABLE **Inicio Vigente:** lunes, 12 de agosto de 2024 **Días de Obra:** 60  
**Subprograma:** 01.03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS **Inicio Real:** lunes, 12 de agosto de 2024 **Monto Contratado:** \$1,660,430.62  
**Residente:** ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA **Fin Vigente:** jueves, 10 de octubre de 2024 **Monto Ejercido:**  
**Fin Real:** jueves, 10 de octubre de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/08/2024	40.86%	40.88%	50.0%
2	30/09/2024	95.31%		
3	30/10/2024	100.00%		
4	29/11/2024	100.00%		
5	29/12/2024	100.00%		
6	28/01/2025	100.00%		
7	27/02/2025	100.00%		

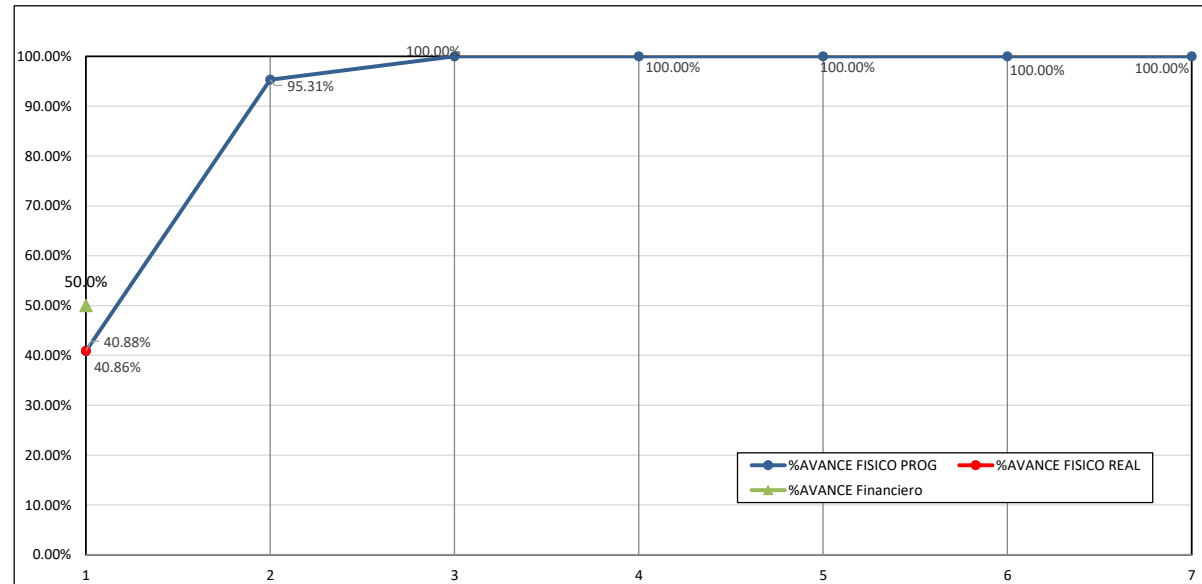

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
