

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 001 005/2024 REHABILITACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARGENTINA TRAMO DE AV. JUÁREZ A CALLE MÉXICO

**Ubicación:** REHABILITACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS, REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A ESCUELA PRIMARIA REFUGIO MIRANDA AGUAYO  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** FAISMUN 001 005/2024

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 **Contratista:** MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.


**Programa:** SF,SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN **Inicio Vigente:** viernes, 19 de abril de 2024 **Días de Obra:** 60

**Subprograma:** 01,03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS **Inicio Real:** viernes, 19 de abril de 2024 **Monto Contratado:** \$2,602,998.21

**Residente:** ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** martes, 2 de julio de 2024 **Monto Ejercido:** \$2,602,998.21

**Fin Real:** martes, 2 de julio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/04/2024	0.26%	0.44%	48.63%
2	03/05/2024	2.22%	3.66%	48.63%
3	17/05/2024	7.05%	9.43%	48.63%
4	31/05/2024	17.12%	19.87%	64.90%
5	14/06/2024	49.76%	55.63%	92.10%
6	28/06/2024	99.44%	99.45%	92.1%
7	12/07/2024	100.00%	100.00%	100.00%
8	26/07/2024	100.00%	100.00%	100.00%
9	09/08/2024	100.00%	100.00%	100.00%

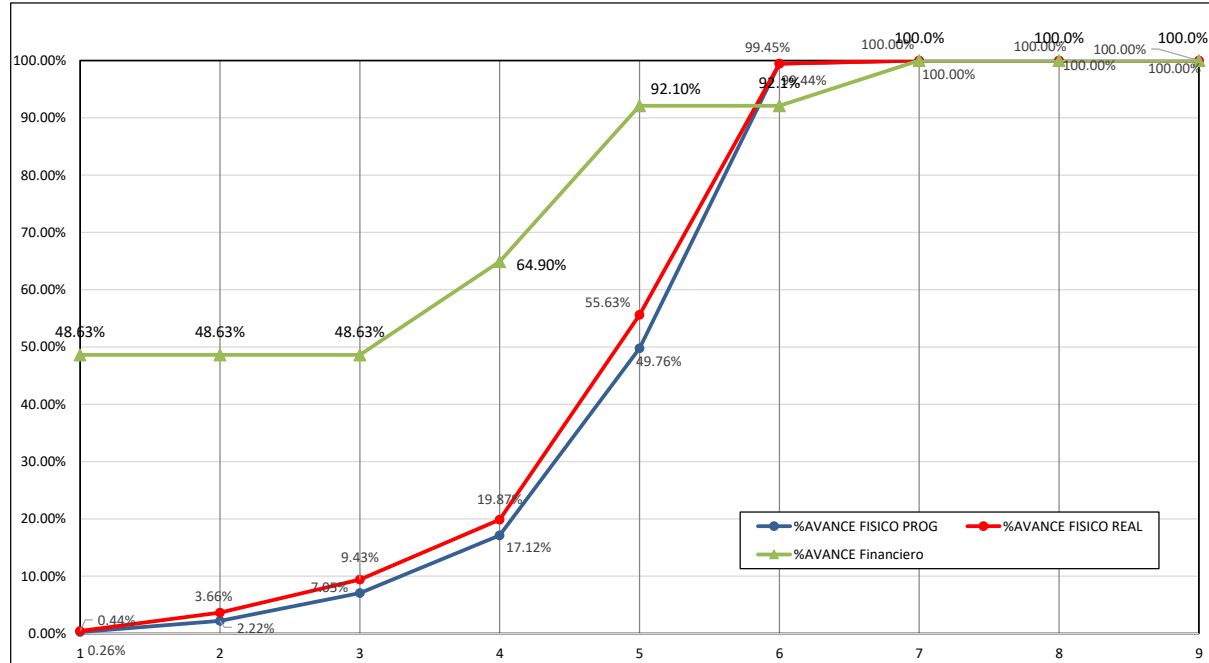

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
