

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 002 006 008 012 013/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE 12 DE DICIEMBRE

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TEODORO OLIVARES DE CALLE FCO. I. MADERO A CALLE ARTICULO 27

REHABILITACIÓN DE LA RED CENTRAL DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE ANTONIO FEMAT DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN A CALLE FRANCISCO VILLA

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CASUARINA DE CALLE ALAMILLO A CALLE MEZQUITE

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SABINO DE CALLE ALAMILLO A CALLE CASUARINA

**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** FAISMUN 002 006 008 012 013/2024

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 **Contratista:** CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V


**Programa:** SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN **Inicio Vigente:** lunes, 6 de mayo de 2024 **Días de Obra:** 90

**Subprograma:** 01,03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS **Inicio Real:** lunes, 6 de mayo de 2024 **Monto Contratado:** \$16,828,568.24

**Residente:** ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** sábado, 3 de agosto de 2024 **Monto Ejercido:** \$16,828,568.24

**Fin Real:** sábado, 3 de agosto de 2024 Se solicita nota de credito

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	12/05/2024	2.44%	2.91%	49.0%
2	19/05/2024	4.88%	4.94%	49.0%
3	26/05/2024	8.01%	8.09%	49.7%
4	02/06/2024	12.05%	12.21%	49.7%
5	09/06/2024	16.09%	19.08%	54.5%
6	16/06/2024	21.37%	24.26%	59.6%
7	23/06/2024	29.58%	32.64%	60.3%
8	30/06/2024	37.31%	37.98%	60.3%
9	07/07/2024	65.76%	66.46%	68.1%
10	14/07/2024	80.38%	81.06%	77.0%
11	21/07/2024	92.25%	92.66%	77.0%
12	28/07/2024	100.00%	100.00%	82.3%
13	04/08/2024	100.00%	100.00%	82.3%
14	11/08/2024	100.00%	100.00%	91.0%
15	18/08/2024	100.00%	100.00%	91.0%
16	25/08/2024	100.00%	100.00%	96.1%
17	01/09/2024	100.00%	100.00%	96.1%
18	08/09/2024	100.00%	100.00%	100.0%
19	15/09/2024	100.00%	100.00%	100.0%
20	22/09/2024	100.00%	100.00%	100.0%

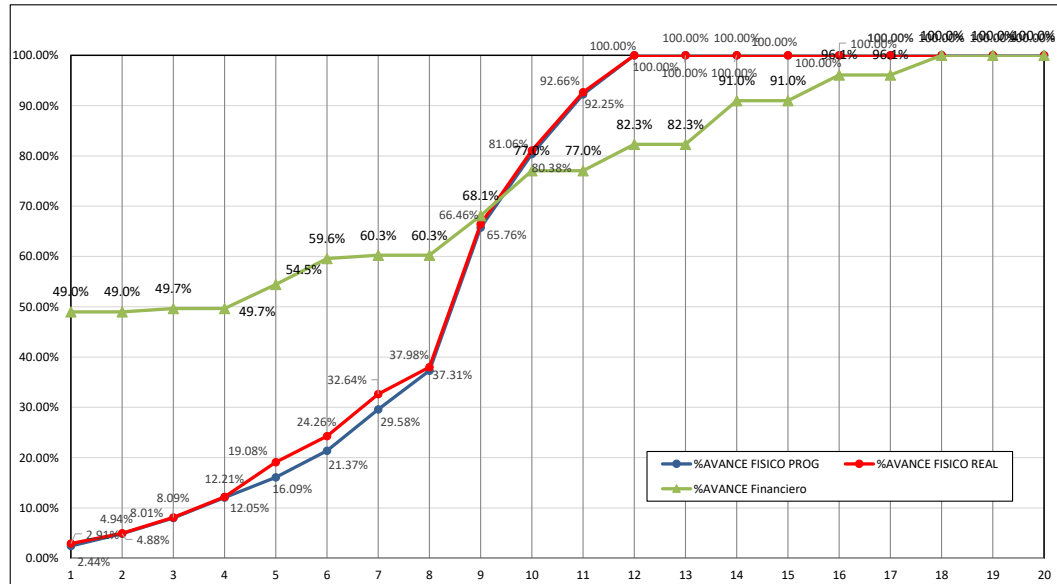

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
