


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 003/2024 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE 1 DE MAYO A CALLE 5 DE MAYO

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato: FAISMUN 003/2024	
Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024	Contratista: CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	
Programa: SF,SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN SD ALCANTARILLADO SC AGUA POTABLE	Inicio Vigente: viernes, 19 de abril de 2024	Días de Obra: 60
Subprograma: 01,03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	Inicio Real: viernes, 19 de abril de 2024	Monto Contratado: \$2,092,650.50
Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA	Fin Vigente: lunes, 17 de junio de 2024	Monto Ejercido: \$1,655,445.96
	Fin Real: lunes, 17 de junio de 2024	Se solicita nota de credito

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/04/2024	0.00%	0.00%	63.2%
2	30/04/2024	13.82%	19.64%	63.2%
3	30/05/2024	34.73%	65.95%	90.9%
4	30/06/2024	100.00%	100.00%	99.3%
5	31/07/2024	100.00%	100.00%	100.0%
6	31/08/2024	100.00%	100.00%	100.0%
7	30/09/2024	100.00%	100.00%	100.0%
8	30/10/2024	100.00%	100.00%	100.0%
9	30/11/2024	100.00%	100.00%	100.0%

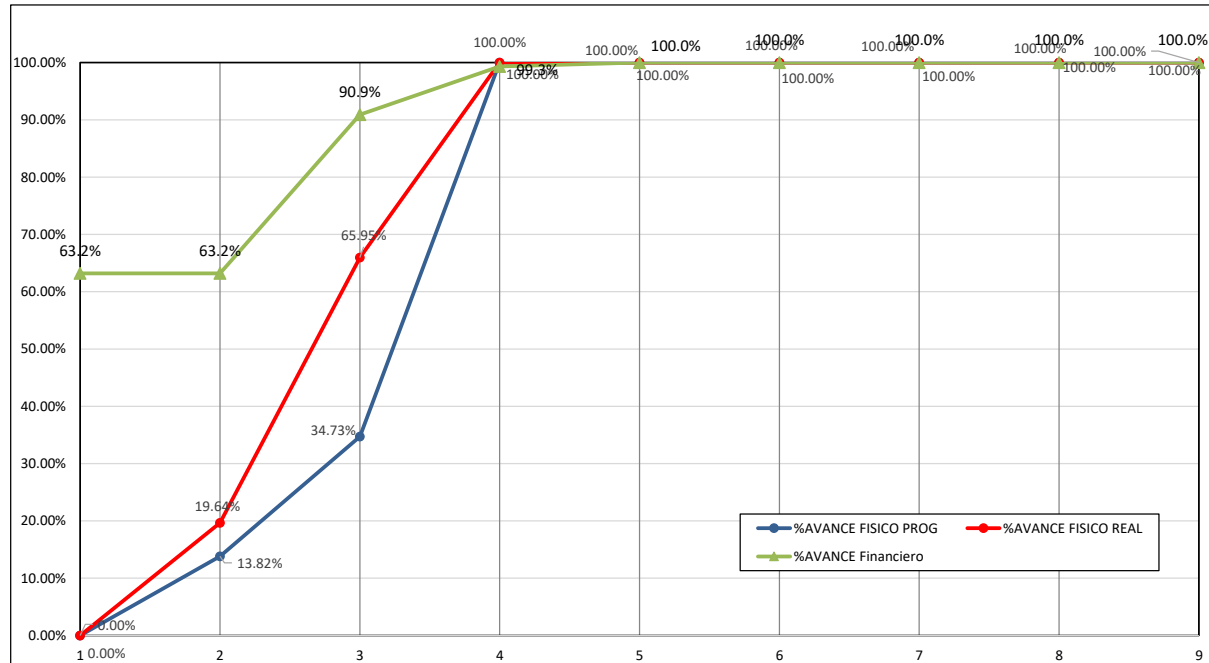

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
