

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 007/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LEONA VICARIO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE EMILIANO ZAPATA

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** FAISMUN 007/2024

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 **Contratista:** GCVICA, S.A. DE C.V.


Programa: SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES SE URBANIZACIÓN SD ALCANTARILLADO **Inicio Vigente:** jueves, 16 de mayo de 2024 **Días de Obra:** 30

Subprograma: 01,02,03 REHABILITACIÓN, ASFALTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS **Inicio Real:** jueves, 16 de mayo de 2024 **Monto Contratado:** \$869,027.20

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** viernes, 14 de junio de 2024 **Monto Ejercido:** \$869,027.20

Fin Real: viernes, 14 de junio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/05/2024	2.46%	3.35%	50.0%
2	26/05/2024	31.15%	42.49%	50.0%
3	02/06/2024	65.30%	65.80%	50.0%
4	09/06/2024	84.73%	90.59%	66.2%
5	16/06/2024	100.00%	100.00%	66.2%
6	23/06/2024	100.00%	100.00%	77.7%
7	30/06/2024	100.00%	100.00%	77.7%
8	07/07/2024	100.00%	100.00%	100.0%
9	14/07/2024	100.00%	100.00%	100.0%

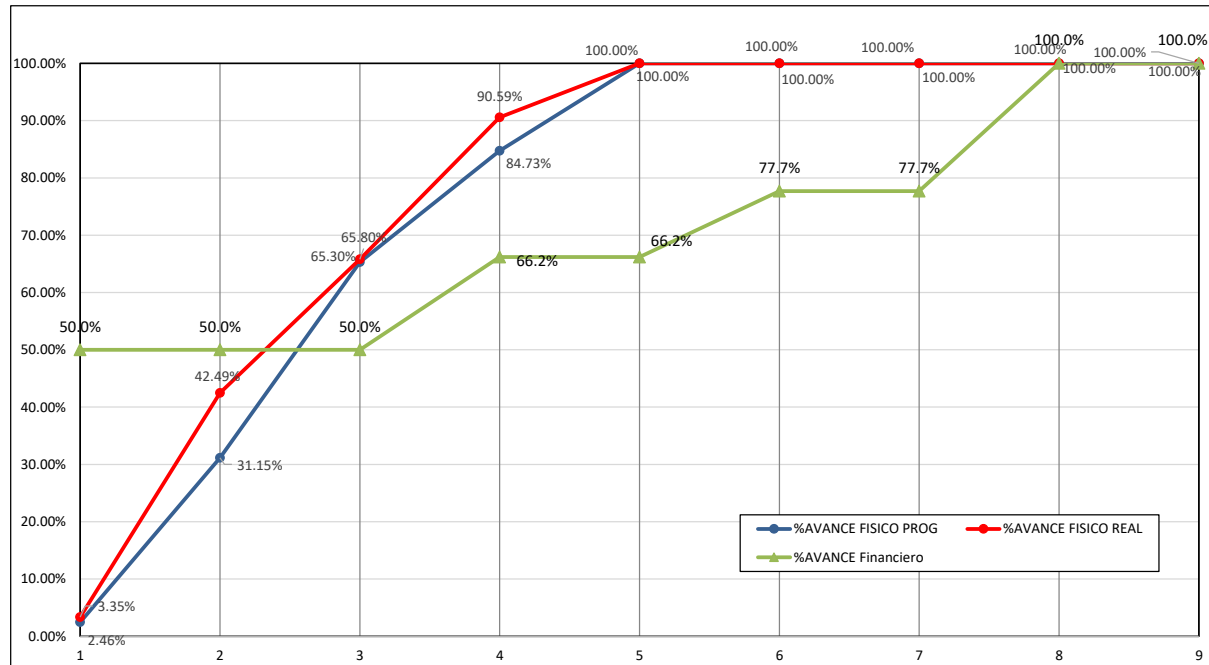

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
