


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	FAISMUN 009/2024 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VIÑEDOS MARQUITOS DE AV. CONSTITUCION A CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS		
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	FAISMUN 009/2024
Tipo de inversión:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024	Contratista:	URDAZ SUPERVISIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
Programa:	SF,SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN	Inicio Vigente:	viernes, 19 de abril de 2024
		Días de Obra:	45
Subprograma:	01,03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	Inicio Real:	viernes, 19 de abril de 2024
		Monto Contratado:	\$2,161,838.84
Residente:	ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA	Fin Vigente:	domingo, 2 de junio de 2024
		Monto Ejercido:	\$2,161,838.84
		Fin Real:	domingo, 2 de junio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/04/2024	1.51%	1.79%	50.0%
2	28/04/2024	5.65%	5.99%	50.0%
3	05/05/2024	12.47%	15.13%	50.0%
4	12/05/2024	28.77%	37.72%	50.0%
5	19/05/2024	59.89%	69.23%	50.0%
6	26/05/2024	85.46%	91.89%	64.8%
7	02/06/2024	100.00%	100.00%	64.8%
8	09/06/2024	100.00%	100.00%	64.8%
9	16/06/2024	100.00%	100.00%	81.6%
10	23/06/2024	100.00%	100.00%	92.3%
11	30/06/2024	100.00%	100.00%	92.3%
12	07/07/2024	100.00%	100.00%	100.0%

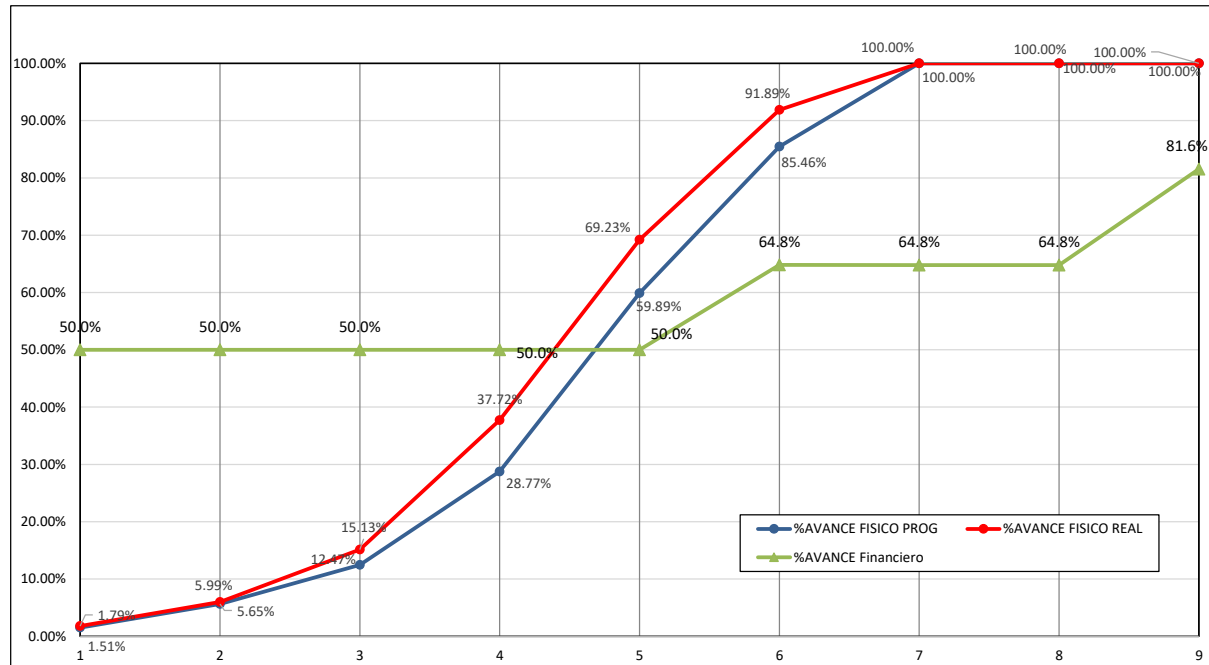

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
