

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 010 011/2024 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUIS ECHEVERRIA DE LIMITE NORTE DEL ARROLLO A CALLE JOSE NIEVES ORNELAS SALCEDO

**CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE NIEVES ORNELAS SALCEDO DE CALLE LUIS ECHEVERRIA A CALLE VENUSTIANO CARRANZA NORTE**

**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO      **Contrato:** FAISMUN 010 011/2024

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024      **Contratista:** BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.,


**Programa:** SE URBANIZACIÓN      **Inicio Vigente:** viernes, 19 de abril de 2024      **Días de Obra:** 60

**Subprograma:** 03,03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS      **Inicio Real:** viernes, 19 de abril de 2024      **Monto Contratado:** \$2,023,801.02

**Residente:** ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA      **Fin Vigente:** lunes, 17 de junio de 2024      **Monto Ejercido:** \$1,277,679.08

**Fin Real:** lunes, 17 de junio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	20/04/2024	0.18%	0.31%	50.0%
2	27/04/2024	2.33%	2.25%	50.0%
3	04/05/2024	7.23%	7.84%	50.0%
4	11/05/2024	15.19%	18.88%	50.0%
5	18/05/2024	24.49%	31.32%	50.0%
6	25/05/2024	30.85%	39.82%	85.2%
7	01/06/2024	63.07%	70.10%	85.2%
8	08/06/2024	86.13%	88.79%	87.9%
9	15/06/2024	99.39%	99.54%	89.2%
10	22/06/2024	100.00%	100.00%	94.4%
11	29/06/2024	100.00%	100.00%	94.4%
12	06/07/2024	100.00%	100.00%	100.0%

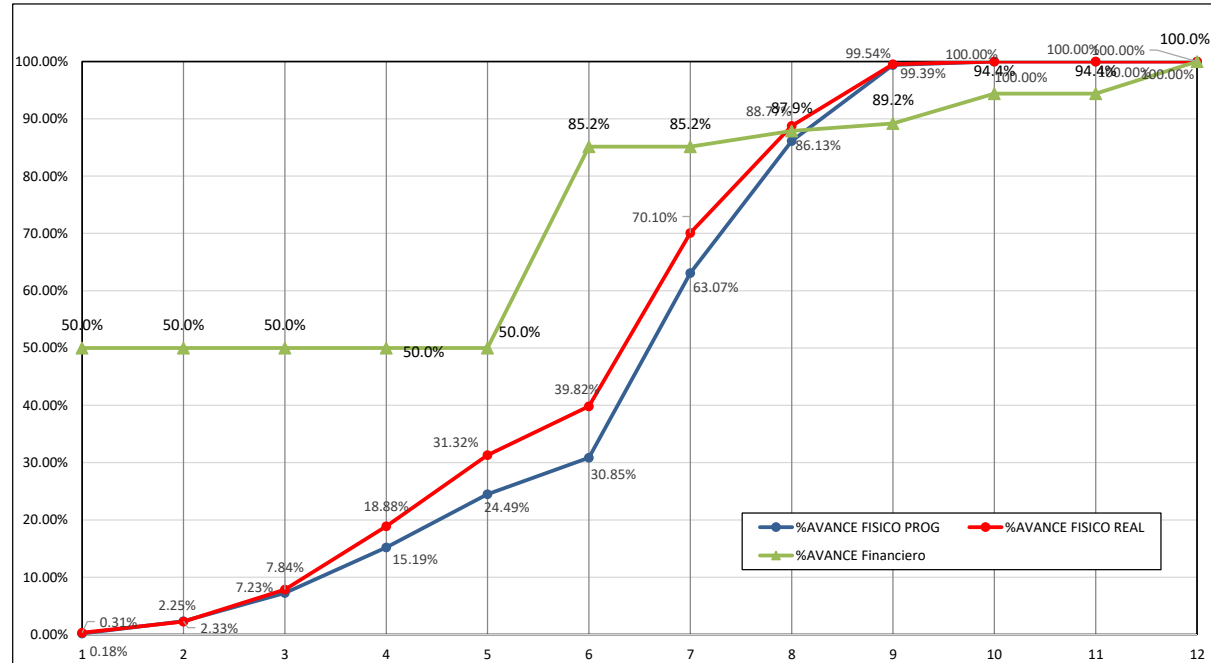

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
