


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	FAISMUN 015/2024 REHABILITACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS, REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE			
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	FAISMUN 015/2024	
Tipo de inversión:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024	Contratista:	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.,	
Programa:	SF,SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN SD ALCANTARILLADO SC AGUA POTABLE	Inicio Vigente:	viernes, 7 de junio de 2024	Días de Obra: 60
Subprograma:	01,03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	Inicio Real:	viernes, 7 de junio de 2024	Monto Contratado: \$1,935,766.45
Residente:	ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA	Fin Vigente:	lunes, 5 de agosto de 2024	Monto Ejercido: \$1,935,766.45
		Fin Real:	lunes, 5 de agosto de 2024	

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	08/06/2024	2.28%	2.71%	49.5%
2	15/06/2024	10.66%	12.18%	49.5%
3	22/06/2024	15.80%	18.13%	49.5%
4	29/06/2024	23.42%	25.56%	49.5%
5	06/07/2024	34.09%	36.02%	49.5%
6	13/07/2024	56.38%	56.81%	56.6%
7	20/07/2024	72.04%	72.53%	56.6%
8	27/07/2024	85.19%	85.54%	70.3%
9	03/08/2024	99.36%	99.47%	70.3%
10	10/08/2024	100.00%	100.00%	70.3%
11	17/08/2024	100.00%	100.00%	95.9%
12	24/08/2024	100.00%	100.00%	99.0%
13	31/08/2024	100.00%	100.00%	99.0%
14	07/09/2024	100.00%	100.00%	100.0%
15	14/09/2024	100.00%	100.00%	100.0%

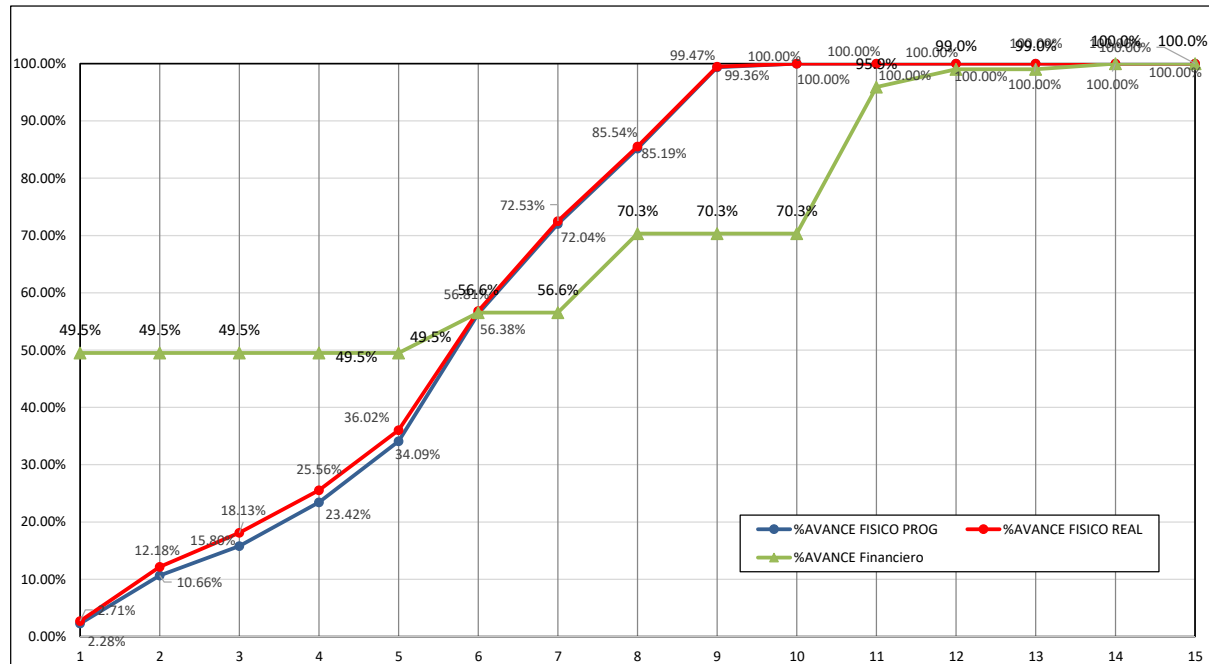

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
