

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 017 FR 001/2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE DE CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE A CALLE VICENTE GUERRERO ORIENTE

RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, TERRACERÍAS Y SEÑALÉTICA, CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE VICENTE GUERRERO.

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** FAISMUN 017 FR 001/2024

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 **Contratista:** CONSTRUCTORA ANTPAT, S.A. DE C.V.


Programa: SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES SE URBANIZACIÓN **Inicio Vigente:** miércoles, 5 de junio de 2024 **Días de Obra:** 30

Subprograma: 01 CONCRETO **Inicio Real:** miércoles, 5 de junio de 2024 **Monto Contratado:** \$946,095.14

Residente: ARQ. FRANCISCO LOZANO SILVA **Fin Vigente:** jueves, 4 de julio de 2024 **Monto Ejercido:** \$940,445.73

Fin Real: jueves, 4 de julio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	08/06/2024	8.30%	8.35%	50.0%
2	15/06/2024	24.11%	24.74%	50.0%
3	22/06/2024	64.56%	64.61%	50.0%
4	29/06/2024	96.41%	96.43%	50.0%
5	06/07/2024	100.00%	100.00%	62.9%
6	13/07/2024	100.00%	100.00%	62.9%
7	20/07/2024	100.00%	100.00%	64.8%
8	27/07/2024	100.00%	100.00%	100.0%
9	11/08/2024	100.00%	100.00%	100.0%

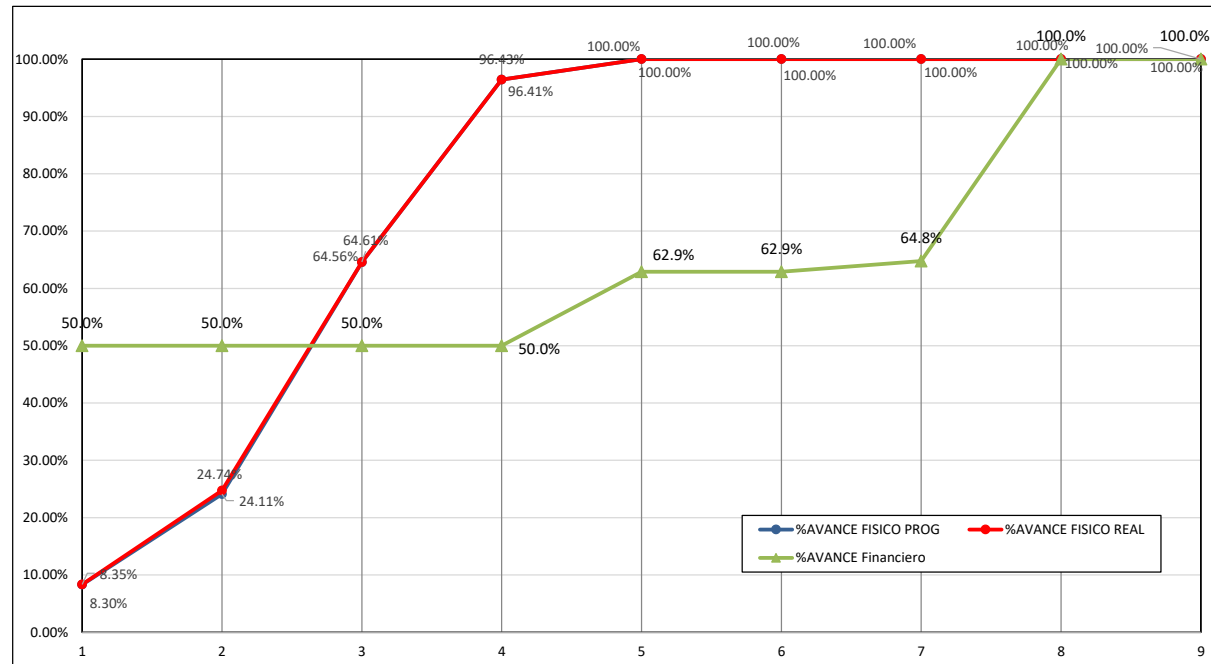

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
