

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 019/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE SABINO  
FAISMUN 022/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE LAZARO CÁRDENAS

**Ubicación:** COLONIA MACARIO J. GOMEZ

**Contrato:** FAISMUN 019 022/2024

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024

**Contratista:** CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

**Programa:** SD ALCANTARILLADO  
SC AGUA POTABLE

**Inicio Vigente:** lunes, 7 de octubre de 2024

**Días de Obra:** 30

**Subprograma:** 01 REHABILITACIÓN

**Inicio Real:** lunes, 7 de octubre de 2024

**Monto Contratado:** \$841,406.58


**Residente:** ING. JUAN BELMARES VENTURA

**Fin Vigente:** martes, 5 de noviembre de 2024

**Monto Ejercido:** \$841,406.58

**Fin Real:** martes, 5 de noviembre de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	12/10/2024	24.86%	33.89%	43.9%
2	19/10/2024	53.65%	59.45%	43.9%
3	26/10/2024	73.83%	74.97%	43.9%
4	02/11/2024	95.27%	96.09%	43.9%
5	09/11/2024	100.00%	100.00%	78.0%
6	16/11/2024	100.00%	100.00%	78.0%
7	23/11/2024	100.00%	100.00%	83.8%
8	30/11/2024	100.00%	100.00%	100.0%
9	07/12/2024	100.00%	100.00%	100.0%

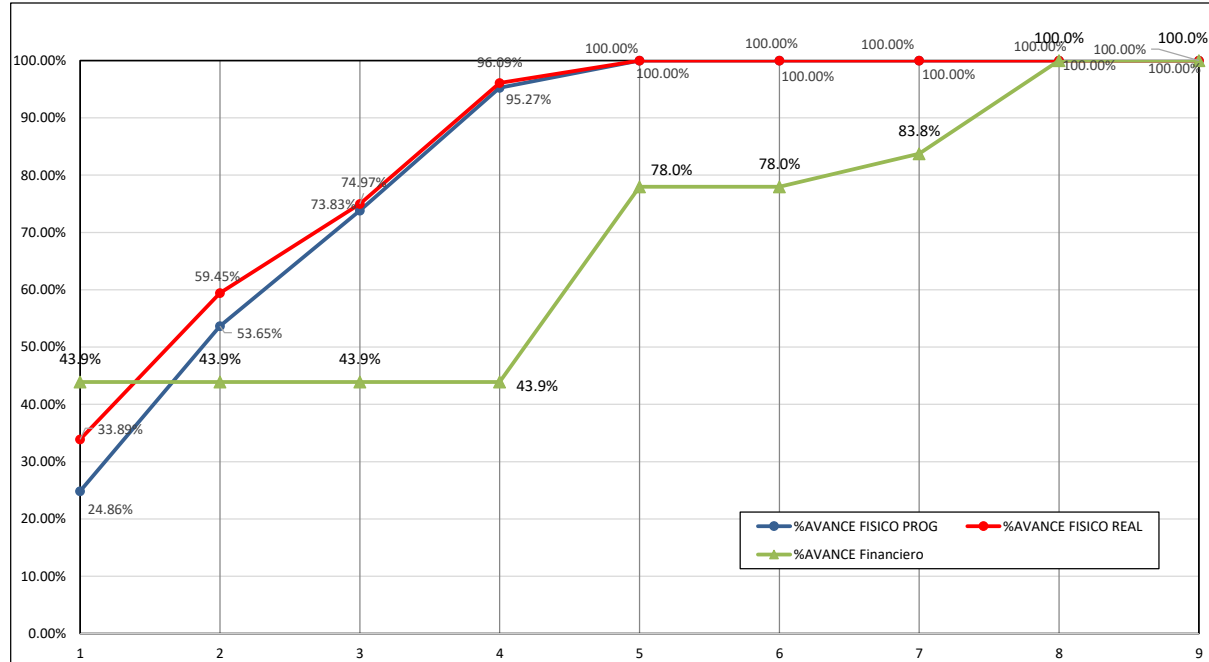

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
