

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 020/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PIRUL

**Ubicación:** COLONIA MACARIO J. GOMEZ

**Contrato:** FAISMUN 020/2024

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024

**Contratista:** BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.

**Programa:** SD ALCANTARILLADO  
SC AGUA POTABLE

**Inicio Vigente:** sábado, 5 de octubre de 2024

**Días de Obra:** 45

**Subprograma:** 01 REHABILITACIÓN

**Inicio Real:** sábado, 5 de octubre de 2024

**Monto Contratado:** \$932,786.91


**Residente:** ING. JUAN BELMARES VENTURA

**Fin Vigente:** lunes, 18 de noviembre de 2024

**Monto Ejercido:** \$932,786.91

**Fin Real:** lunes, 18 de noviembre de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/10/2024	12.47%	13.32%	49.5%
2	31/10/2024	56.42%	60.33%	49.5%
3	15/11/2024	95.00%	95.12%	97.4%
4	30/11/2024	100.00%	100.00%	100.0%

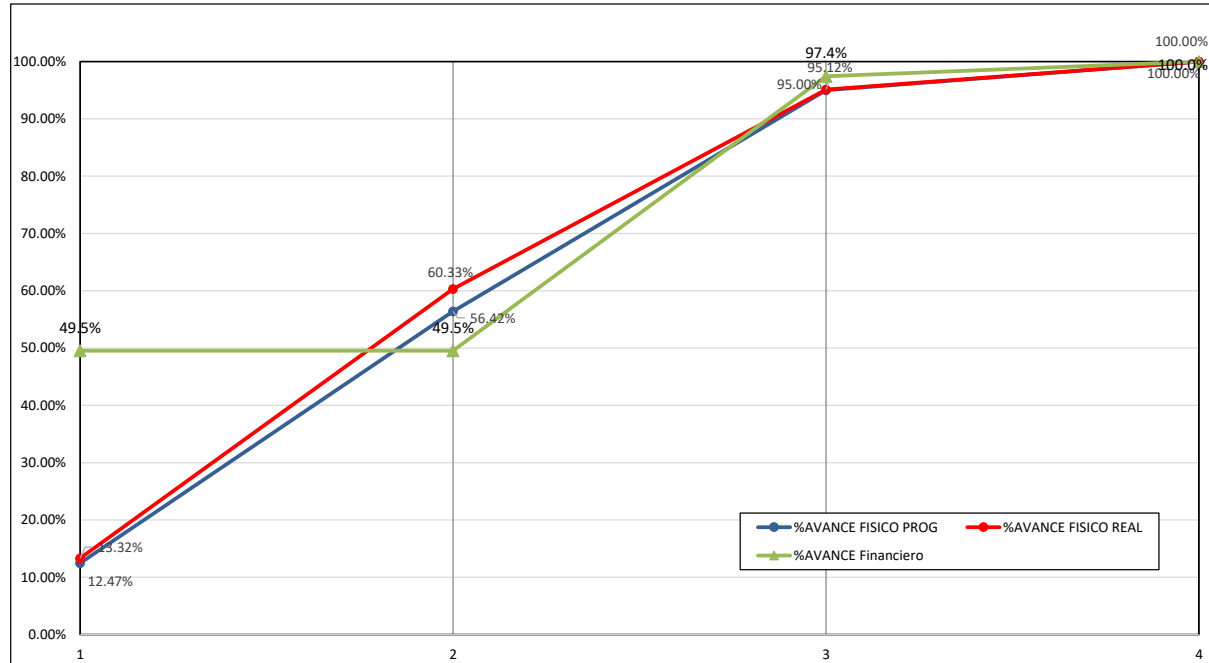

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
