

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 021/2024 REHABILITACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA, RED DE ALCANTARILLADO, RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE LA CALLE FRANCISCO PONCE Y CALLE MEZQUITE CALLE POSTERIOR CASUARINA

Ubicación: COLONIA MACARIO J. GOMEZ **Contrato:** FAISMUN 021/2024

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 **Contratista:** CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.


Programa: SD ALCANTARILLADO **Inicio Vigente:** viernes, 11 de octubre de 2024 **Días de Obra:** 45

Subprograma: 01,03 REHABILITACIÓN **Inicio Real:** viernes, 11 de octubre de 2024 **Monto Contratado:** \$1,272,082.70

Residente: ING. JUAN BELMARES VENTURA **Fin Vigente:** domingo, 24 de noviembre de 2024 **Monto Ejercido:** \$1,076,635.58

Fin Real: domingo, 24 de noviembre de 2024 Se solicita nota de credito

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/10/2024	5.91%	7.81%	59.1%
2	31/10/2024	78.10%	79.12%	59.1%
3	15/11/2024	93.47%	94.75%	85.1%
4	30/11/2024	100.00%	100.00%	87.6%
5	15/12/2024	100.00%	100.00%	100.0%

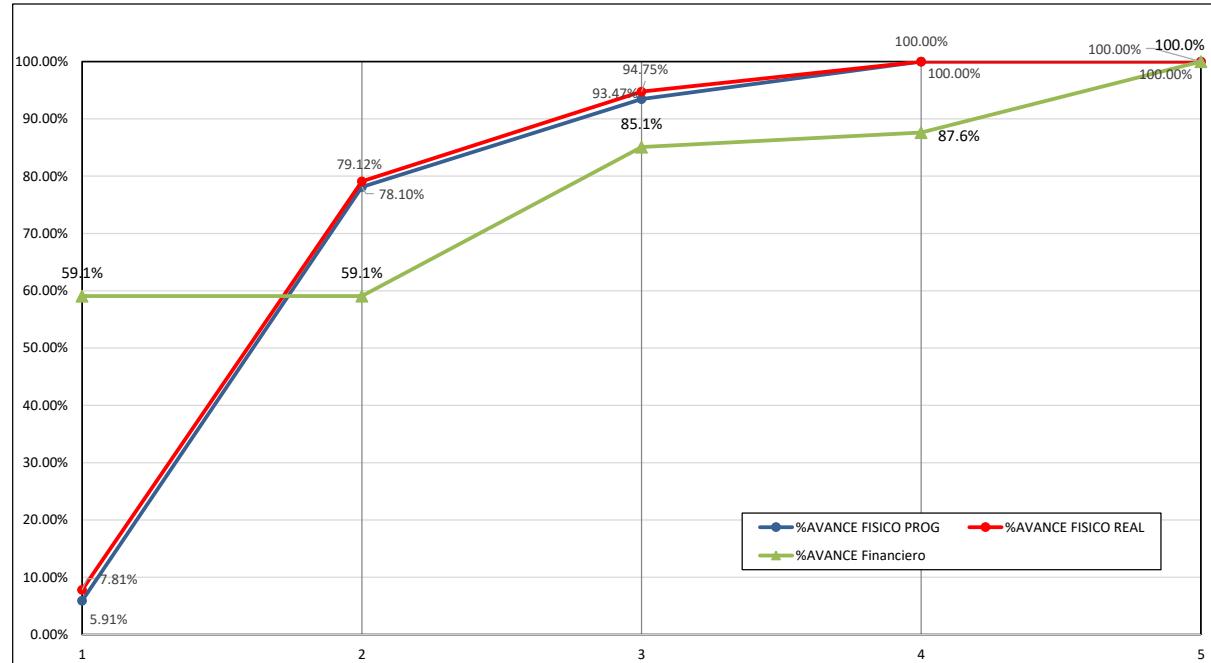

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
