

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF24 006 FAISMUN 023/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE TRAMO 21 DE MARZO A 12 DE DICIEMBRE Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE 24 DE FEBRERO TRAMO 15 DE SEPTIEMBRE A 16 DE SEPTIEMBRE

Ubicación: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE TRAMO 21 DE MARZO - LIB. LUIS MOYA, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE TRAMO 21 DE MARZO - LIB. LUIS MOYA. EN LA COLONIA 28 DE ABRIL, **Contrato:** PF24 006 FAISMUN 023/2024

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 **Contratista:** ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


Programa: SD ALCANTARILLADO **Inicio Vigente:** miércoles, 11 de diciembre de 2024 **Días de Obra:** 60

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN **Inicio Real:** miércoles, 11 de diciembre de 2024 **Monto Contratado:** \$2,306,475.60

Residente: ING. Ramiro Abinabad Delgadillo Esparza **Fin Vigente:** sábado, 8 de febrero de 2025 **Monto Ejercido:** \$2,306,475.60

Fin Real: sábado, 8 de febrero de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	14/12/2024	5.08%	5.11%	49.5%
2	21/12/2024	20.38%	20.41%	49.5%
3	28/12/2024	45.19%	45.63%	49.5%
4	04/01/2025	64.87%	64.98%	49.5%
5	11/01/2025	75.43%		
6	18/01/2025	82.26%		
7	25/01/2025	90.12%		
8	01/02/2025	96.67%		
9	16/02/2025	100.00%		

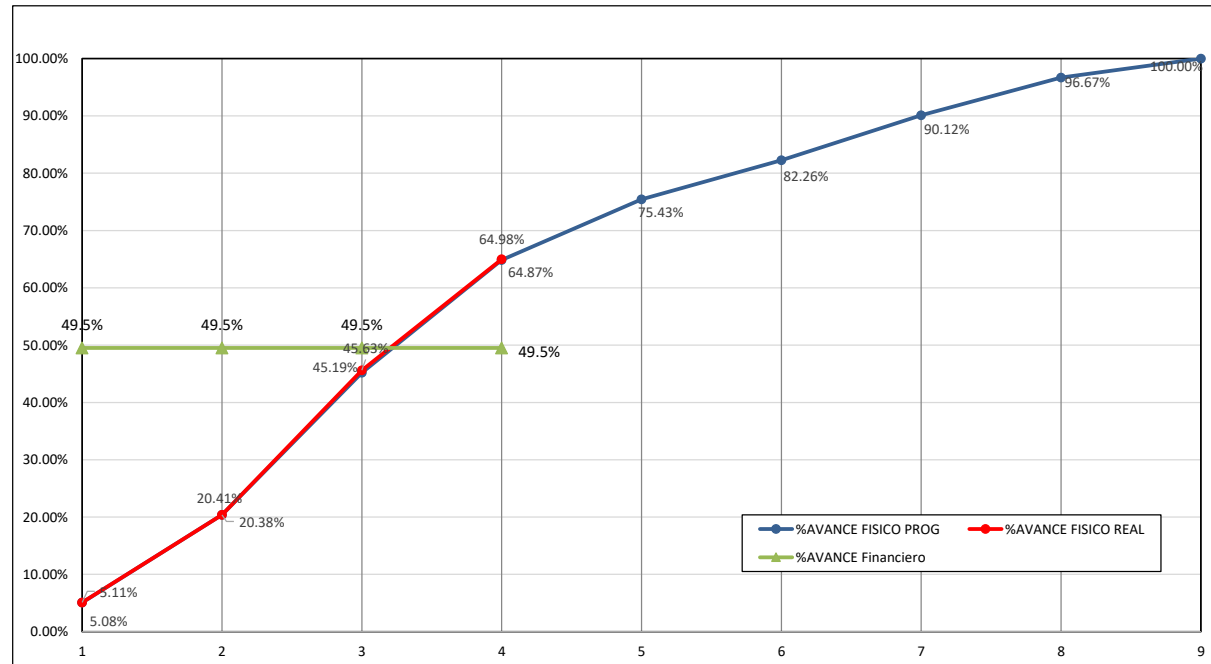

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
