

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 024/2024 CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA NORTE

Ubicación: RESERVA NORTE PUERTECITO DE LA VIRGEN

Contrato: FAISMUN 024/2024

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024

Contratista: EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.

Programa: SE URBANIZACIÓN

Inicio Vigente: jueves, 21 de noviembre de 2024

Días de Obra: 21

Subprograma: 03 GUARNICIONES Y BANQUETAS

Inicio Real: jueves, 21 de noviembre de 2024

Monto Contratado: \$589,952.86


Residente: ARQ. JOSE ALFREDO DE VELASCO LARA

Fin Vigente: miércoles, 11 de diciembre de 2024

Monto Ejercido: \$589,952.86

Fin Real: miércoles, 11 de diciembre de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	24/11/2024	18.38%	27.45%	0.0%
2	01/12/2024	50.57%	59.49%	0.0%
3	08/12/2024	85.34%	94.94%	0.0%
4	15/12/2024	100.00%	100.00%	99.2%
5	22/12/2024	100.00%	100.00%	100.0%

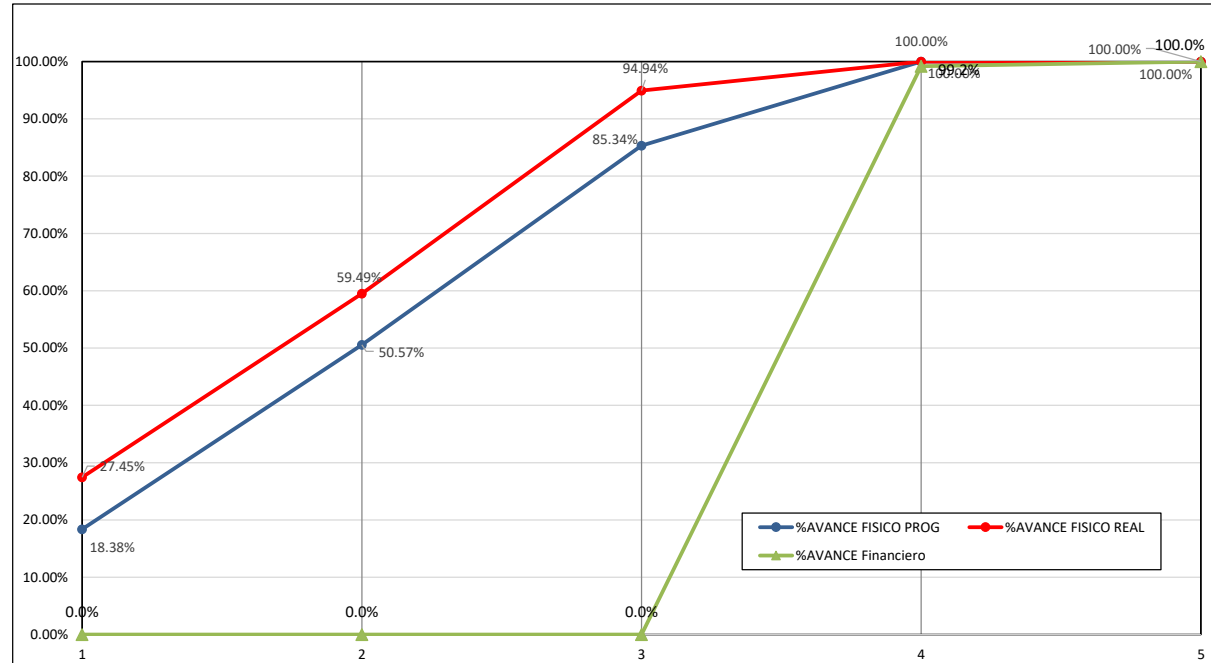

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
