

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 025/2024 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN ZONA NORTE

**Ubicación:** ZONA NORTE

**Contrato:** FAISMUN 025/2024

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024

**Contratista:** FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

**Programa:** SH VIVIENDA DIGNA

**Inicio Vigente:** viernes, 20 de diciembre de 2024

**Días de Obra:** 60

**Subprograma:** 02 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA

**Inicio Real:** viernes, 20 de diciembre de 2024

**Monto Contratado:** \$2,376,952.04


**Residente:** ARQ. JAIME ADAIR ESPINOSA MORA

**Fin Vigente:** lunes, 17 de febrero de 2025

**Monto Ejercido:** \$2,376,952.04

**Fin Real:** lunes, 17 de febrero de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/01/2025	20.55%	20.55%	50.0%
2	20/01/2025	54.45%		
3	04/02/2025	86.65%		
4	19/02/2025	100.00%		
5	06/03/2025	100.00%		

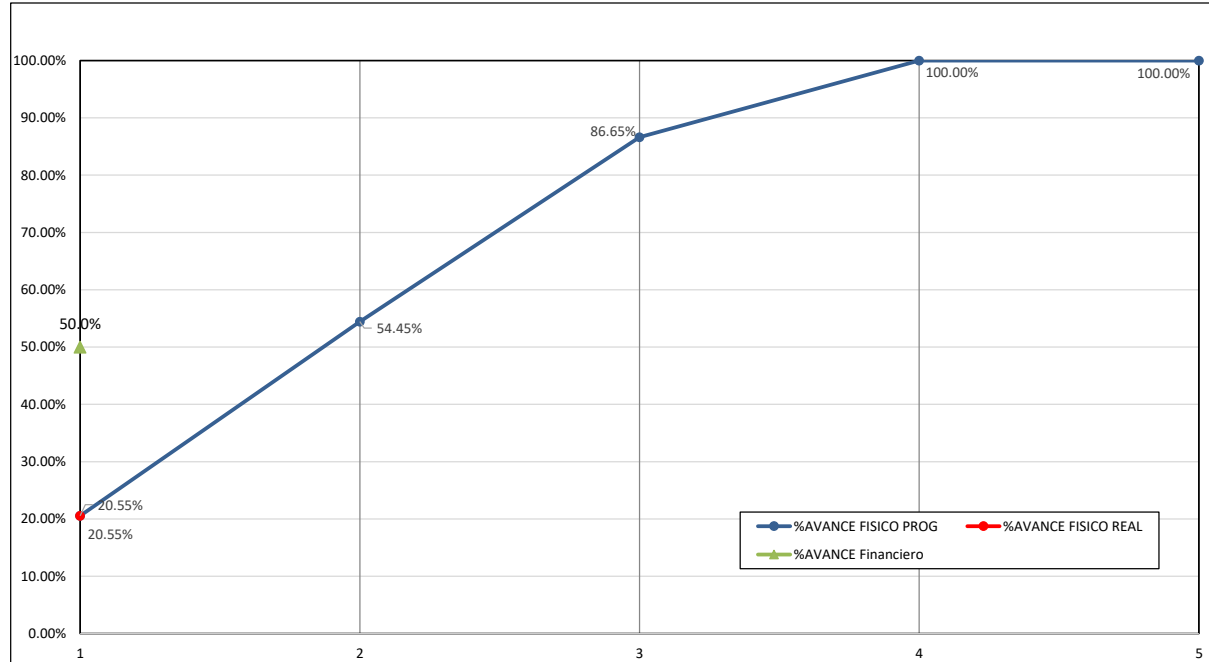

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
