

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 026/2024 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN ZONA SUR

**Ubicación:** ZONA SUR

**Contrato:** FAISMUN 025/2024

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024

**Contratista:** DAPAC DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.,

**Programa:** SH VIVIENDA DIGNA

**Inicio Vigente:** viernes, 20 de diciembre de 2024

**Días de Obra:** 60

**Subprograma:** 02 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA

**Inicio Real:** viernes, 20 de diciembre de 2024

**Monto Contratado:** \$2,454,547.43


**Residente:** ARQ. JAIME ADAIR ESPINOSA MORA

**Fin Vigente:** lunes, 17 de febrero de 2025

**Monto Ejercido:** \$2,454,547.43

**Fin Real:** lunes, 17 de febrero de 2025

| SEMANA | FECHA      | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1      | 04/01/2025 | 18.02%              | 18.02%              | 50.0%              |
| 2      | 19/01/2025 | 48.92%              |                     |                    |
| 3      | 03/02/2025 | 83.97%              |                     |                    |
| 4      | 18/02/2025 | 100.00%             |                     |                    |
| 5      | 05/03/2025 | 100.00%             |                     |                    |

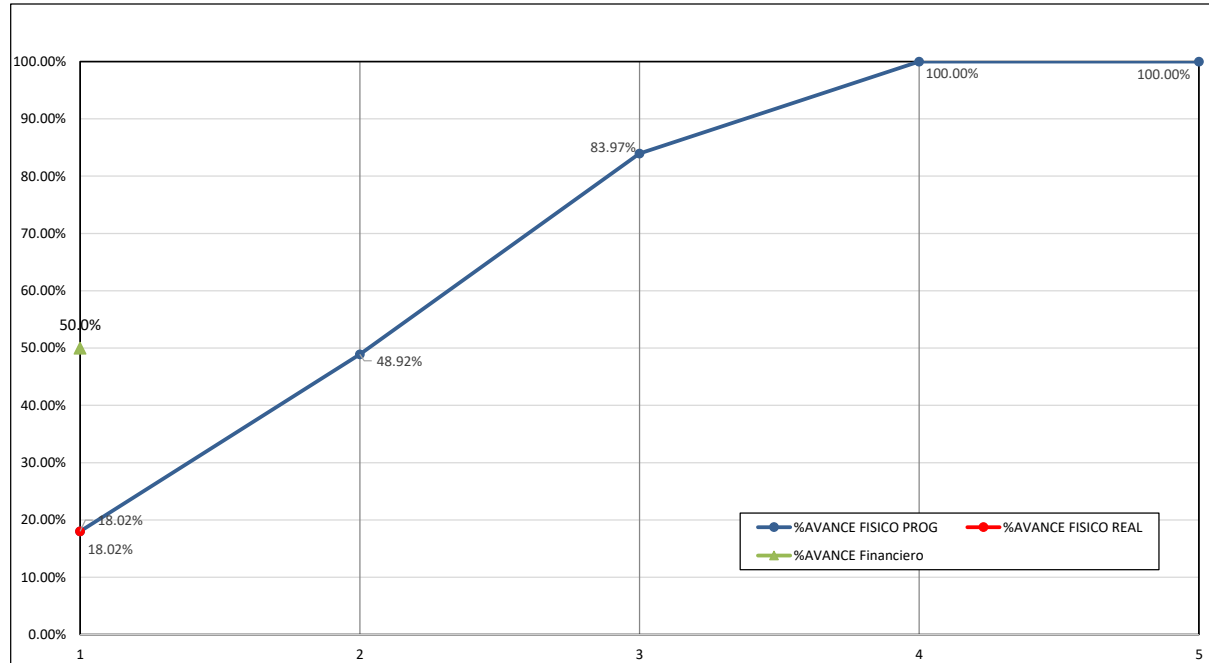

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
