


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	IEA PMSFR 001/2024 PRIMARIA GENERAL JOSE EFREN GARCIA ESPARZA - PRIMARIA GENERAL GERARDO MARIN MARTINEZ				
Ubicación:	FRACC. CEDROS, CABECERA MUNICIPAL	Contrato:	IEA PMSFR 001/2024		
Tipo de inversión:	CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APOYO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Contratista:	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
Programa:		Inicio Vigente:	martes, 27 de febrero de 2024	Días de Obra:	30 días
Subprograma:	01 b) RECONSTRUCCION	Inicio Real:	martes, 27 de febrero de 2024	Monto Contratado:	\$ 1,328,822.46
Residente:	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	Fin Vigente:	miércoles, 27 de marzo de 2024	Monto Ejercido:	\$ 1,328,822.46
		Fin Real:	martes, 12 de marzo de 2024		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	23/02/2024	0.00%	0.00%	49.6%
2	01/03/2024	19.54%	41.87%	49.6%
3	08/03/2024	40.79%	87.40%	90.5%
4	15/03/2024	62.04%	100.00%	100.0%
5	22/03/2024	95.54%	100.00%	100.0%
6	29/03/2024	100.00%	100.00%	100.0%

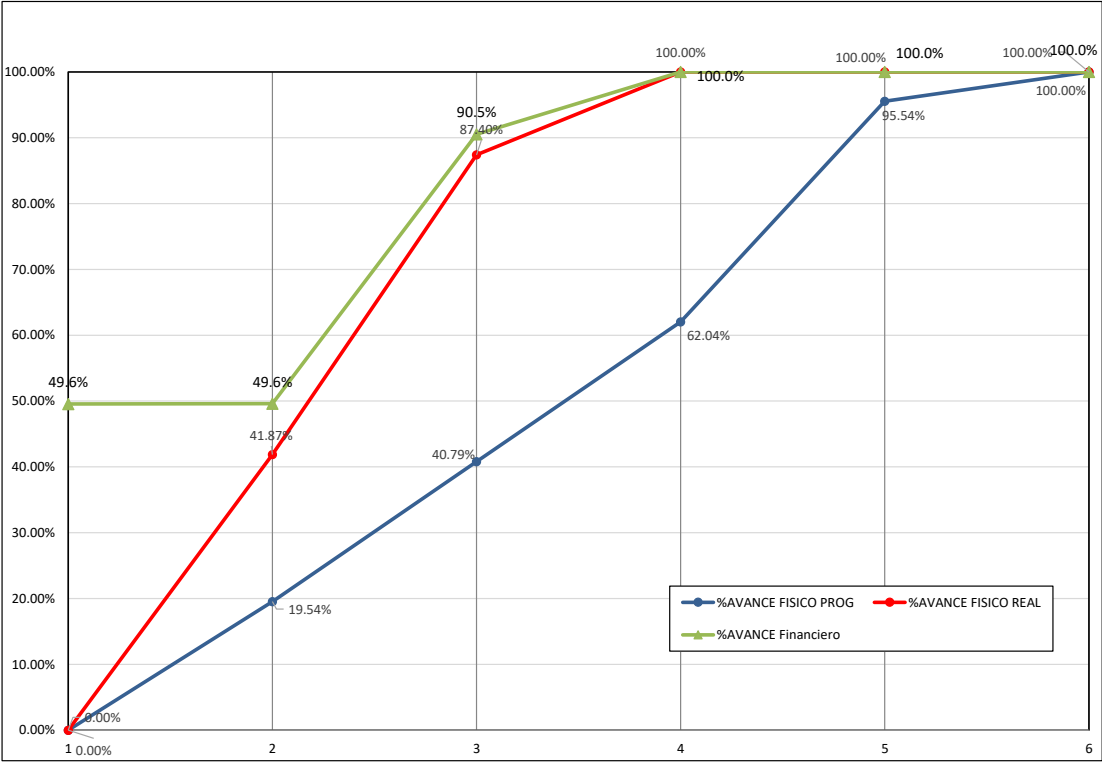

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
