


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	IP 001 A/2024 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 18 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA)				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	IP 001 A/2024		
Tipo de inversión:	IP INGRESOS PROPIOS 2024	Contratista:	C. IGNACIO JIMENEZ ARMAS		
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Inicio Vigente:	viernes, 19 de enero de 2024	Días de Obra:	210
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	viernes, 19 de enero de 2024	Monto Contratado:	\$149,999.83
Residente:	ARQ. MIGUEL ÁNGEL CASTORENA ARIAS	Fin Vigente:	jueves, 15 de agosto de 2024	Monto Ejercido:	
		Fin Real:	jueves, 15 de agosto de 2024		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/01/2024	0.00%	0.00%	0.0%
2	30/01/2024	0.00%	0.00%	0.0%
3	15/02/2024	6.27%	6.27%	0.0%
4	01/03/2024	8.01%	8.01%	0.0%
5	15/03/2024	31.29%	31.29%	0.0%
6	30/03/2024	35.18%	35.18%	0.0%
7	15/04/2024	37.50%	37.50%	34.6%
8	30/04/2024	42.72%	42.72%	53.7%
9	15/05/2024	54.90%	54.90%	53.7%
10	30/05/2024	61.28%	61.28%	53.7%
11	15/06/2024	65.92%	65.92%	53.7%
12	30/06/2024	69.40%	69.40%	53.7%
13	15/07/2024	74.04%	74.04%	53.7%
14	30/07/2024	75.78%	75.78%	71.7%
15	15/08/2024	100.00%	100.00%	71.7%
16	30/08/2024	100.00%	100.00%	71.7%
17	14/09/2024	100.00%	100.00%	100.0%
18	29/09/2024	100.00%	100.00%	100.0%
19	14/10/2024	100.00%	100.00%	100.0%

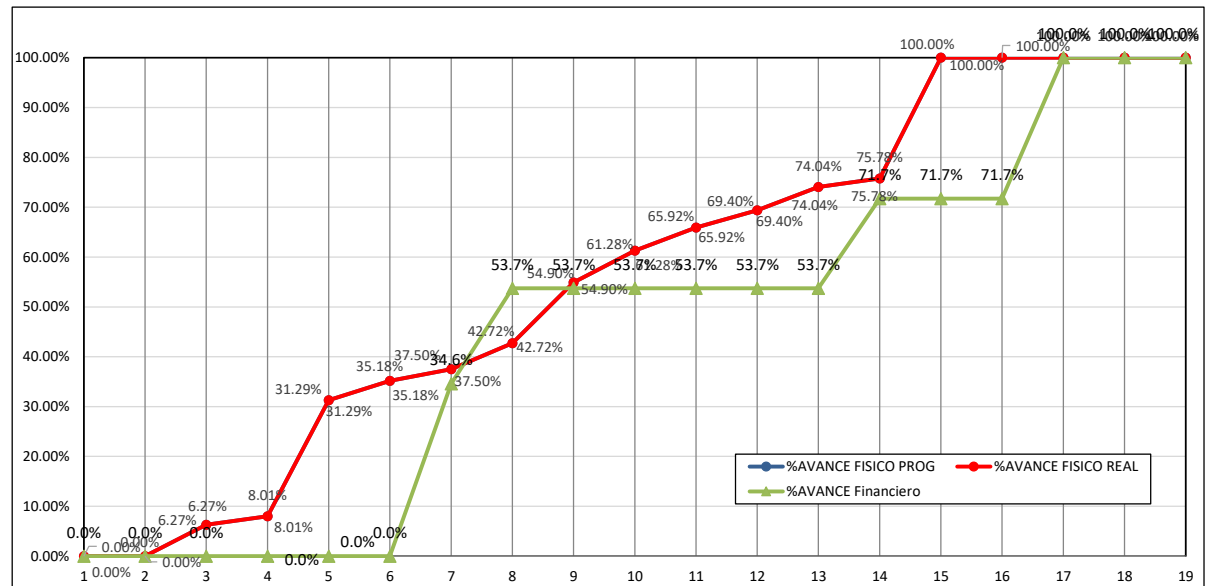

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
