

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 002/2024 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL "JARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA VEGA"

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: IP 002/2024

Tipo de inversión: IP INGRESOS PROPIOS 2024

Contratista: O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.

Programa: DA EDIFICIOS PÚBLICOS

Inicio Vigente: sábado, 24 de agosto de 2024

Días de Obra: 60

Subprograma: 03 CONSTRUCCIÓN

Inicio Real: sábado, 24 de agosto de 2024

Monto Contratado: \$800,000.00


Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Fin Vigente: martes, 22 de octubre de 2024

Monto Ejercido: \$800,000.00

Fin Real: martes, 22 de octubre de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/08/2024	0.18%	0.54%	46.9%
2	15/09/2024	12.27%	12.73%	46.9%
3	30/09/2024	41.80%	42.26%	46.9%
4	15/10/2024	86.15%	86.54%	69.3%
5	30/10/2024	100.00%	100.00%	69.3%
6	14/11/2024	100.00%	100.00%	100.0%

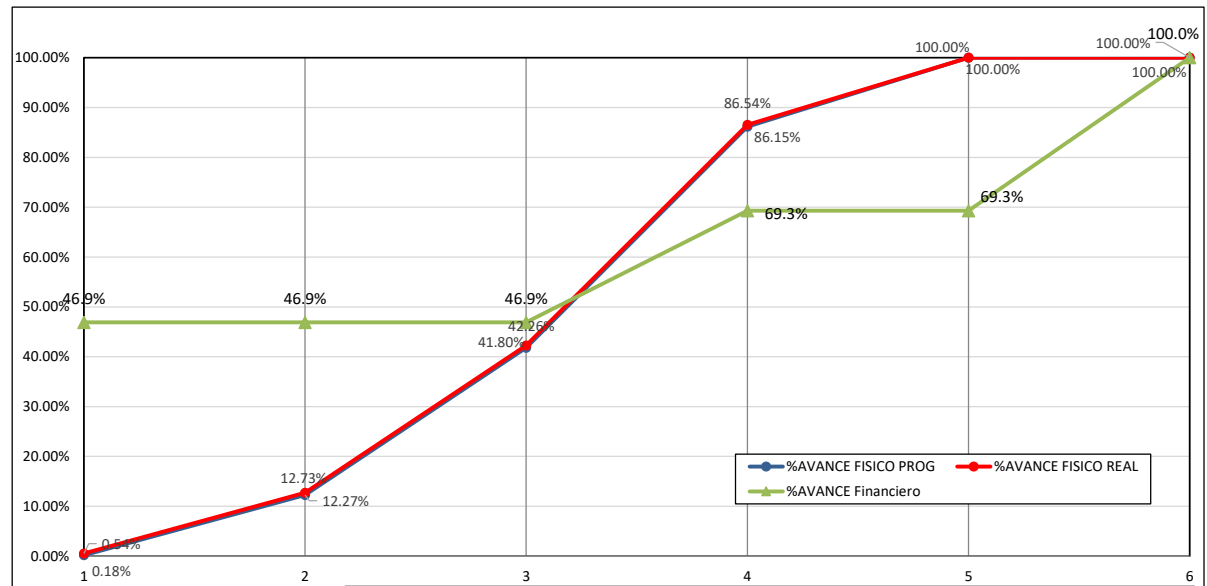

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
