

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 003/2024 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN EL ACCESO SUR DE LA COMUNIDAD DE LORETITO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Ubicación: LORETITO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: IP 003/2024

Tipo de inversión: IP INGRESOS PROPIOS 2024

Contratista: ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,

Programa: SE URBANIZACIÓN

Inicio Vigente: lunes, 9 de septiembre de 2024

Días de Obra: 30

Subprograma: 04 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y JARDINES

Inicio Real: lunes, 9 de septiembre de 2024

Monto Contratado: \$831,802.68


Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Fin Vigente: martes, 8 de octubre de 2024

Monto Ejercido: \$831,802.68

Fin Real: martes, 8 de octubre de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	14/09/2024	10.05%	10.05%	0.0%
2	21/09/2024	31.82%	31.82%	0.0%
3	28/09/2024	64.99%	64.99%	56.9%
4	05/10/2024	93.80%	93.80%	56.9%
5	12/10/2024	100.00%	100.00%	56.9%
6	19/10/2024	100.00%	100.00%	100.0%

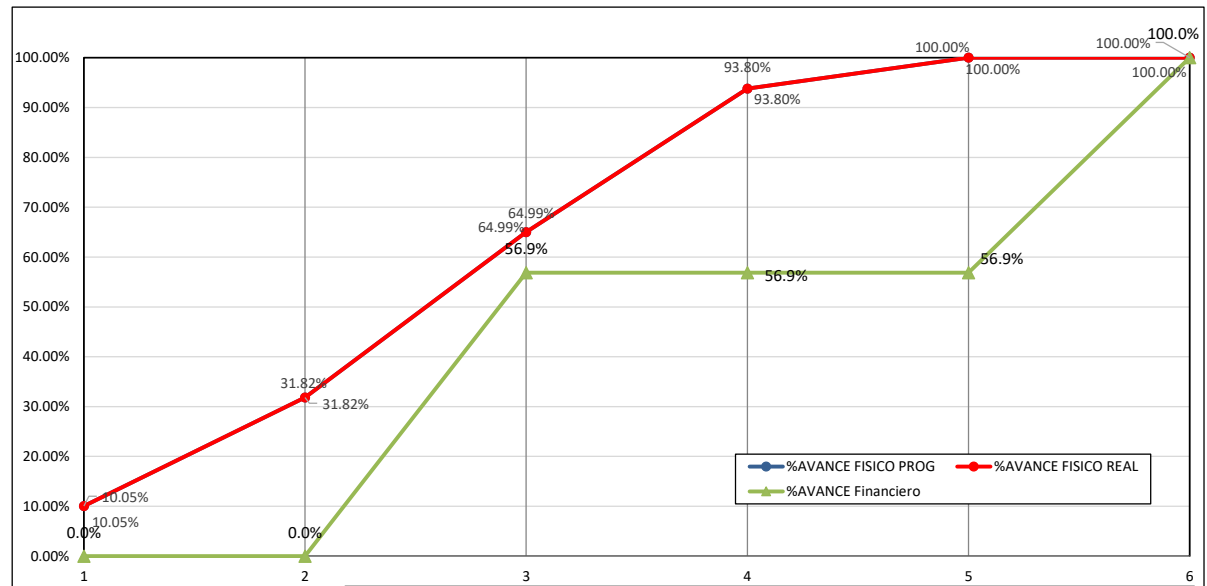

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
