

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 004/2024 REGENERACIÓN URBANA DEL SAN FRANCISCO TRADICIONAL, PINTURA DE FACHADAS ZONA NORTE

Ubicación: CALLES: VICENTE GUERRERO, INDEPENDENCIA, 2 DE ABRIL, 5 DE MAYO, PRIVADA COLON, MORELOS NORTE, ROMO DE VIVAR (TRAMO MADERO-GUERRERO) Y E. ZAPATA (MADERO-INDEPENDENCIA) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: IP 004/2024

Tipo de inversión: IP INGRESOS PROPIOS 2024

Contratista: URDAZ SUPERVISIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

Programa: SH VIVIENDA DIGNA

Inicio Vigente: ESPERANDO ANTICIPO

Días de Obra: 90

Subprograma: 01 a REHABILITACION DE VIVIENDA URBANA

Inicio Real: lunes, 30 de septiembre de 2024

Monto Contratado: \$2,160,090.74


Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Fin Vigente: sábado, 28 de diciembre de 2024

Monto Ejercido: \$2,160,090.74

Fin Real: sábado, 28 de diciembre de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/09/2024	6.38%	6.41%	50.0%
2	15/10/2024	23.40%	23.55%	50.0%
3	30/10/2024	41.84%	41.95%	57.2%
4	14/11/2024	58.86%	58.93%	61.4%
5	29/11/2024	75.18%	75.19%	68.2%
6	14/12/2024	90.78%	90.81%	75.4%
7	29/12/2024	100.00%	100.00%	77.2%
8	13/01/2025	100.00%	100.00%	
9	28/01/2025	100.00%	100.00%	
10	12/02/2025	100.00%	100.00%	

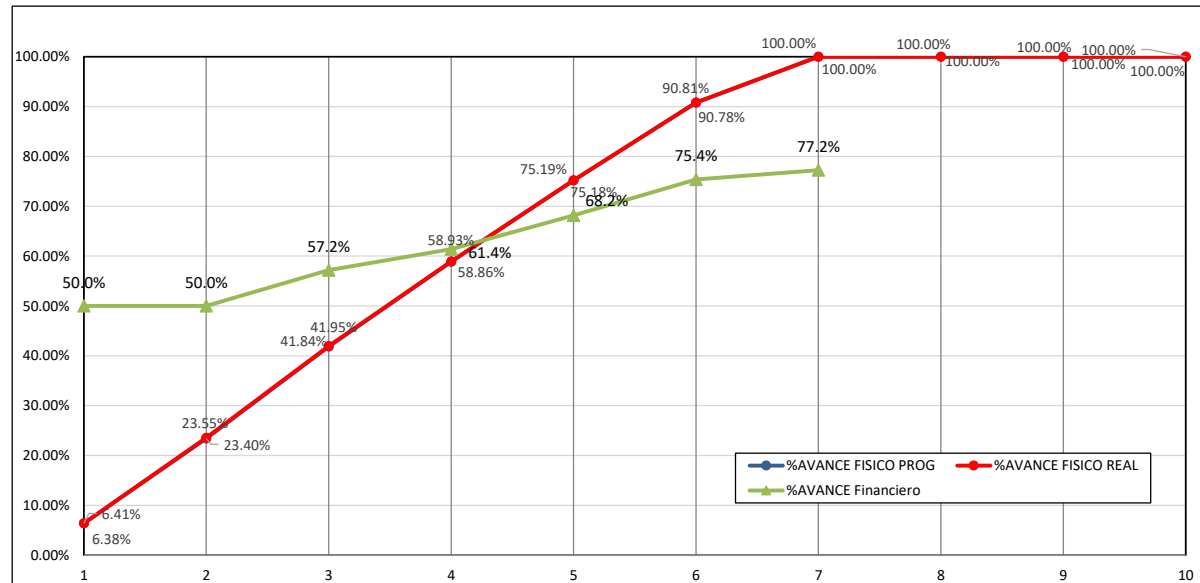

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
