

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 005/2024 REGENERACIÓN URBANA DEL SAN FRANCISCO TRADICIONAL, PINTURA DE FACHADAS ZONA SUR

Ubicación: CALLES: FCO. I. MADERO, E. CARRANZA, PRIVADA ALLENDE, MORELOS SUR, PRIVADA JESUS GARCIA, ROMO DE VIVAR (MADERO-CARRANZA) Y E. ZAPATA (MADERO-CARRANZA) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: IP 005/2024

Tipo de inversión: IP INGRESOS PROPIOS 2024

Contratista: OP INNOVACION EN DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Programa: SH VIVIENDA DIGNA

Inicio Vigente: ESPERANDO ANTICIPO

Días de Obra: 90

Subprograma: 01 a REHABILITACION DE VIVIENDA URBANA

Inicio Real: lunes, 30 de septiembre de 2024

Monto Contratado: \$2,324,904.28


Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Fin Vigente: sábado, 28 de diciembre de 2024

Monto Ejercido:

Fin Real: sábado, 28 de diciembre de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/10/2024	16.48%	16.59%	50.0%
2	30/10/2024	33.12%	33.18%	56.5%
3	14/11/2024	49.86%	49.91%	60.0%
4	29/11/2024	66.37%	66.39%	70.8%
5	14/12/2024	82.82%	82.91%	74.2%
6	29/12/2024	100.00%	100.00%	74.2%
7	13/01/2025	100.00%		
8	28/01/2025	100.00%		
9	12/02/2025	100.00%		
10	27/02/2025	100.00%		

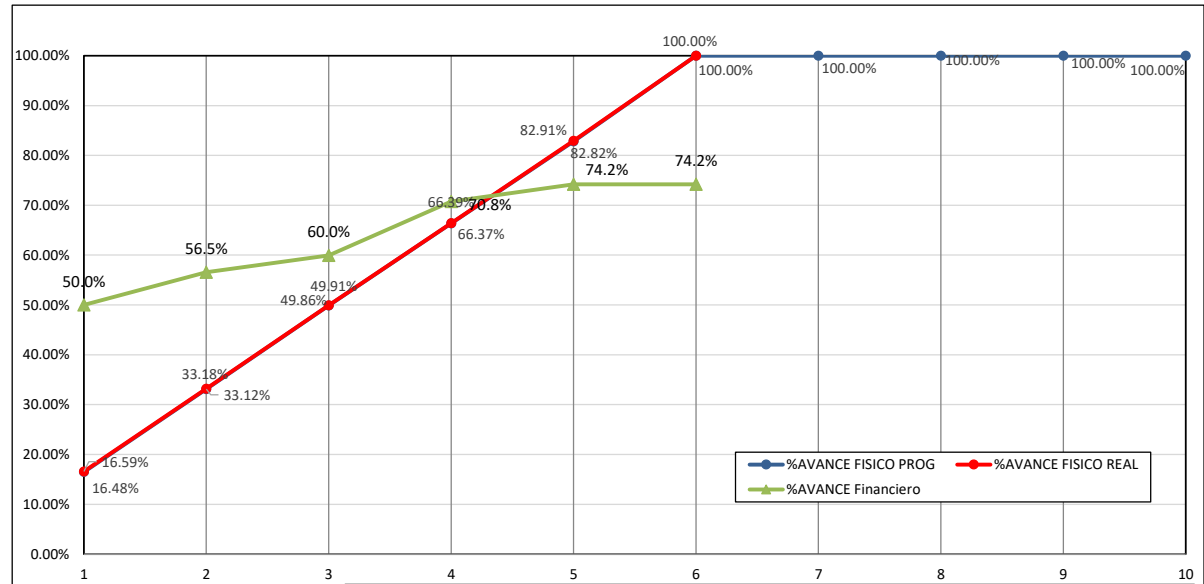

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
