

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IPR 001/2024 REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO, "LÍNEA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS"

Ubicación: COLONIA MACARIO J. GÓMEZ

Contrato: IPR 001/2024

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS, REMANENTE DEL EJERCICIO (2023)

Contratista: ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Programa: SD ALCANTARILLADO

Inicio Vigente: viernes, 11 de octubre de 2024

Días de Obra: 30

Subprograma: 01 REHABILITACION

Inicio Real: viernes, 11 de octubre de 2024

Monto Contratado: \$567,679.33

Residente: ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA


Fin Vigente: sábado, 9 de noviembre de 2024

Monto Ejercido: \$562,155.33

Fin Real: sábado, 9 de noviembre de 2024

Se solicita nota de credito

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	12/10/2024	6.38%	6.38%	49.6%
2	19/10/2024	29.78%	29.78%	49.6%
3	26/10/2024	53.19%	53.19%	49.6%
4	02/11/2024	76.59%	76.59%	57.2%
5	09/11/2024	100.00%	100.00%	72.6%
6	16/11/2024	100.00%	100.00%	87.0%
7	23/11/2024	100.00%	100.00%	99.1%
8	30/11/2024	100.00%	100.00%	100.0%
9	07/12/2024	100.00%	100.00%	100.0%

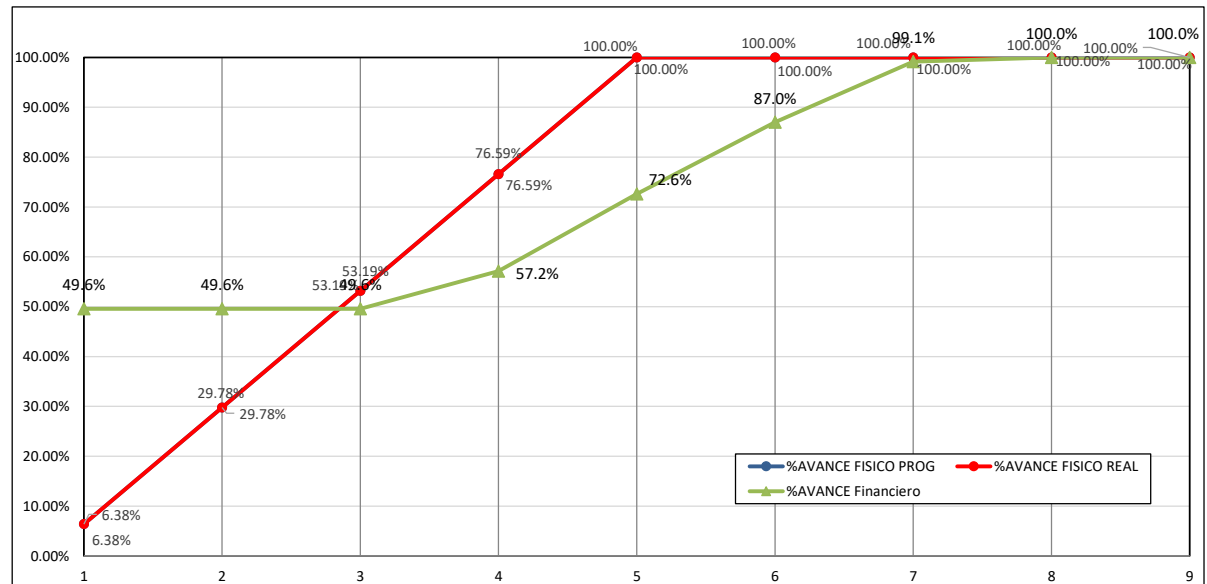

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
