

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IPR 002/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FRESNO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE PALMA, FRACC. LOS CEDROS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ubicación: FRACC. LOS CEDROS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** IPR 002/2024
Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS, REMANENTE DEL EJERCICIO (2023) **Contratista:** JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,


Programa: SD ALCANTARILLADO **Inicio Vigente:** martes, 15 de octubre de 2024 **Días de Obra:** 45

Subprograma: 01 REHABILITACION **Inicio Real:** martes, 15 de octubre de 2024 **Monto Contratado:** \$995,068.24

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** jueves, 28 de noviembre de 2024 **Monto Ejercido:** \$995,068.24

Fin Real: jueves, 28 de noviembre de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	22/10/2024	3.22%	3.64%	48.2%
2	29/10/2024	30.44%	30.85%	48.2%
3	05/11/2024	44.49%	44.94%	48.2%
4	12/11/2024	68.38%	68.73%	48.2%
5	19/11/2024	75.13%	75.68%	48.2%
6	26/11/2024	93.67%	93.89%	48.2%
7	03/12/2024	100.00%	100.00%	48.2%
8	10/12/2024	100.00%	100.00%	48.2%
9	17/12/2024	100.00%	100.00%	48.2%
10	24/12/2024	100.00%	100.00%	48.2%
11	31/12/2024	100.00%	100.00%	48.2%
12	07/01/2025	100.00%		
13	14/01/2025	100.00%		
14	21/01/2025	100.00%		

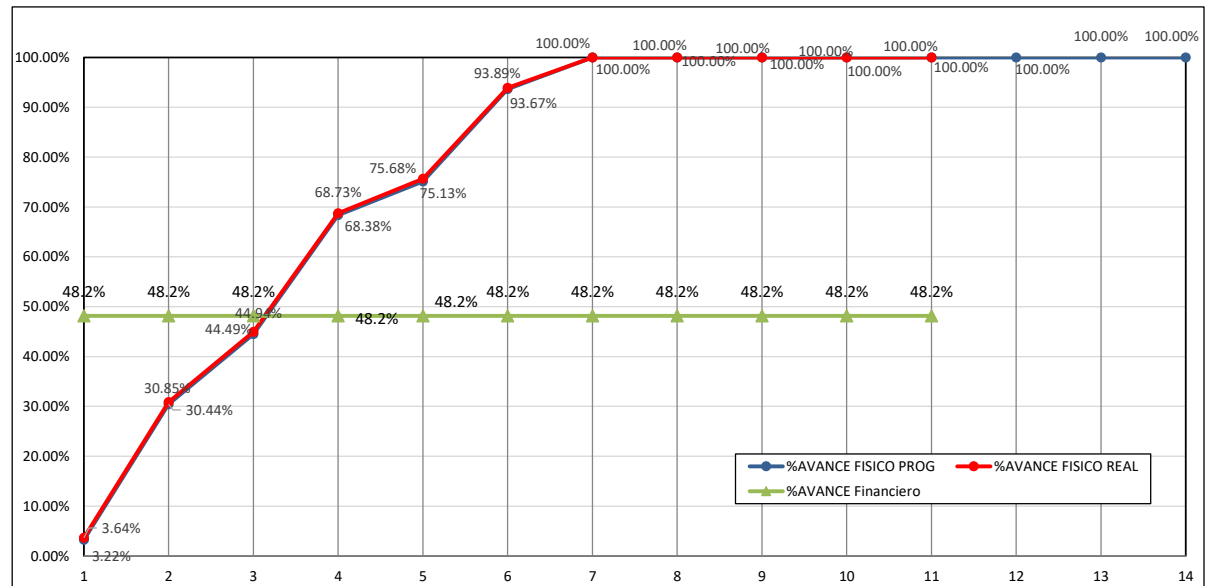

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
