


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 001/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE RED DE LINEA DE CONDUCCIÓN, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA CALLE ROMO DE VIVAR NORTE, TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO A MATAMOROS
Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** PF 001/2024
Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS, DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO 2023 **Contratista:** DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V. ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
Programa: SF SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN SD ALCANTARILLADO SC AGUA POTABLE **Inicio Vigente:** martes, 12 de marzo de 2024 **Días de Obra:** 60
Subprograma: 01, 03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS **Inicio Real:** martes, 12 de marzo de 2024 **Monto Contratado:** \$7,170,346.24
Residente: ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA **Fin Vigente:** viernes, 10 de mayo de 2024 **Monto Ejercido:** \$7,170,346.24
Fin Real: viernes, 10 de mayo de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	12/03/2024	0.00%	0.00%	48.4%
2	30/03/2024	14.86%	14.88%	48.4%
3	15/04/2024	60.02%	45.16%	54.4%
4	30/04/2024	90.32%	90.32%	61.1%
5	15/05/2024	100.00%	100.00%	86.6%
6	30/05/2024	100.00%	100.00%	100.0%

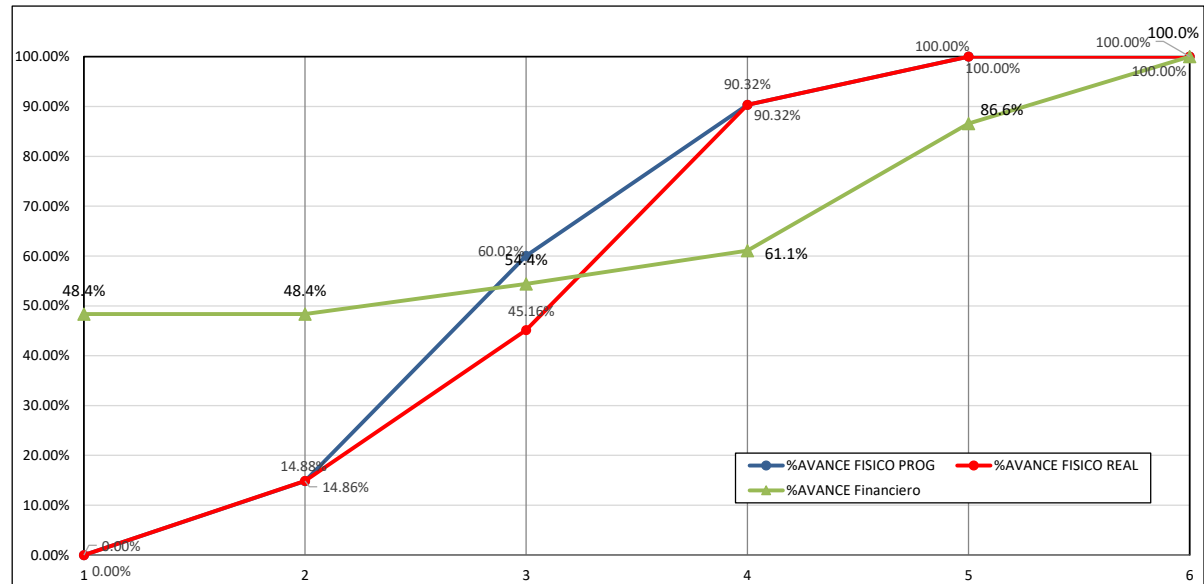

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
