


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PF 002/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA CALLE EMILIO CARRANZA				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	PF 002/2024		
Tipo de inversión:	INGRESOS PROPIOS, DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO 2023	Contratista:	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.,		
Programa:	SF SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN SD ALCANTARILLADO SC AGUA POTABLE	Inicio Vigente:	martes, 12 de marzo de 2024	Días de Obra:	30
Subprograma:	01, 03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	Inicio Real:	martes, 12 de marzo de 2024	Monto Contratado:	\$1,412,198.19
Residente:	ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA	Fin Vigente:	miércoles, 10 de abril de 2024	Monto Ejercido:	\$1,412,198.19
		Fin Real:	miércoles, 10 de abril de 2024		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	12/03/2024	0.00%	0.00%	50.0%
2	30/03/2024	47.20%	47.25%	50.0%
3	15/04/2024	100.00%	100.00%	64.4%
4	30/04/2024	100.00%	100.00%	100.0%

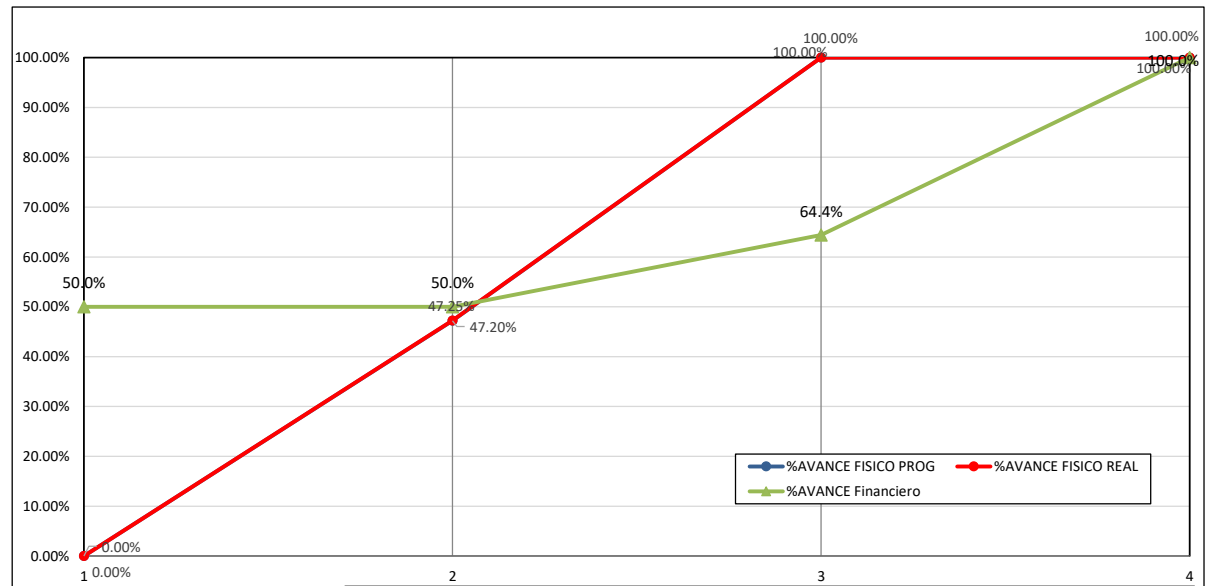

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
