


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

<b>Obra:</b>	PF24 001 D/2024 PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL PLAZA ALFONSO ROMO DE VIVAR, PORTAL Y FACHADAS PRESIDENCIA Y ALMACEN EN AUDITORIO ALFONSO ROMO DE VIVAR, EN CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.;				
<b>Ubicación:</b>	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Contrato:</b>	PF24 001 D/2024		
<b>Tipo de inversión:</b>	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	<b>Contratista:</b>	INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.		
<b>Programa:</b>	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	<b>Inicio Vigente:</b>	sábado, 2 de noviembre de 2024	<b>Días de Obra:</b>	<b>30</b>
<b>Subprograma:</b>	03 SERVICIOS	<b>Inicio Real:</b>	sábado, 2 de noviembre de 2024	<b>Monto Contratado:</b>	<b>\$172,382.45</b>
<b>Residente:</b>	ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA	<b>Fin Vigente:</b>	domingo, 1 de diciembre de 2024	<b>Monto Ejercido:</b>	<b>\$172,382.45</b>
		<b>Fin Real:</b>	domingo, 1 de diciembre de 2024		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/11/2024	3.96%	5.15%	0.0%
2	11/11/2024	17.41%	20.30%	0.0%
3	18/11/2024	43.37%	50.20%	0.0%
4	25/11/2024	78.53%	80.25%	0.0%
5	02/12/2024	100.00%	100.00%	0.0%
6	09/12/2024	100.00%	100.00%	100.0%

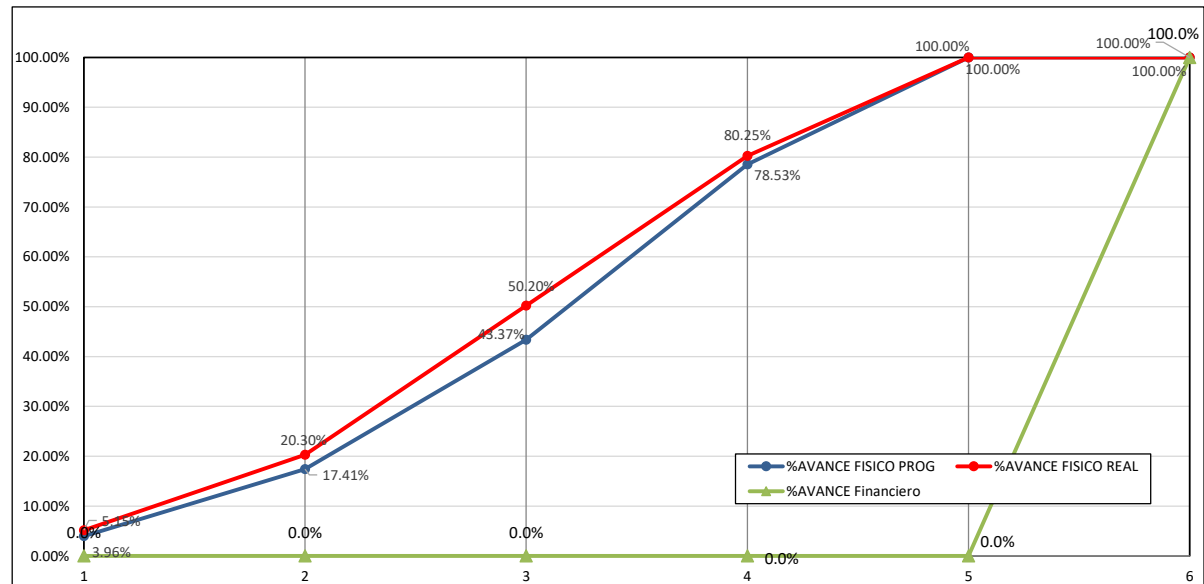

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
