


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF24 003/2024 CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE TAXIS EN CALLE JOSÉ DE ANDA GUTIÉRREZ ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. MÉXICO

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024
Programa: DA EDIFICIOS PÚBLICOS
Subprograma: 03 CONSTRUCCIÓN
Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Contrato: PF24 003/2024
Contratista: ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Inicio Vigente: martes, 28 de mayo de 2024 **Días de Obra:** 30
Inicio Real: martes, 28 de mayo de 2024 **Monto Contratado:** \$609,473.51
Fin Vigente: miércoles, 3 de julio de 2024 **Monto Ejercido:** \$609,473.51
Fin Real: miércoles, 3 de julio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/06/2024	5.27%	5.27%	47.6%
2	11/06/2024	30.20%	30.70%	47.6%
3	18/06/2024	51.00%	51.23%	76.5%
4	25/06/2024	91.56%	93.10%	76.5%
5	02/07/2024	98.11%	99.63%	95.2%
6	09/07/2024	100.00%	100.00%	95.2%
7	16/07/2024	100.00%	100.00%	100.0%

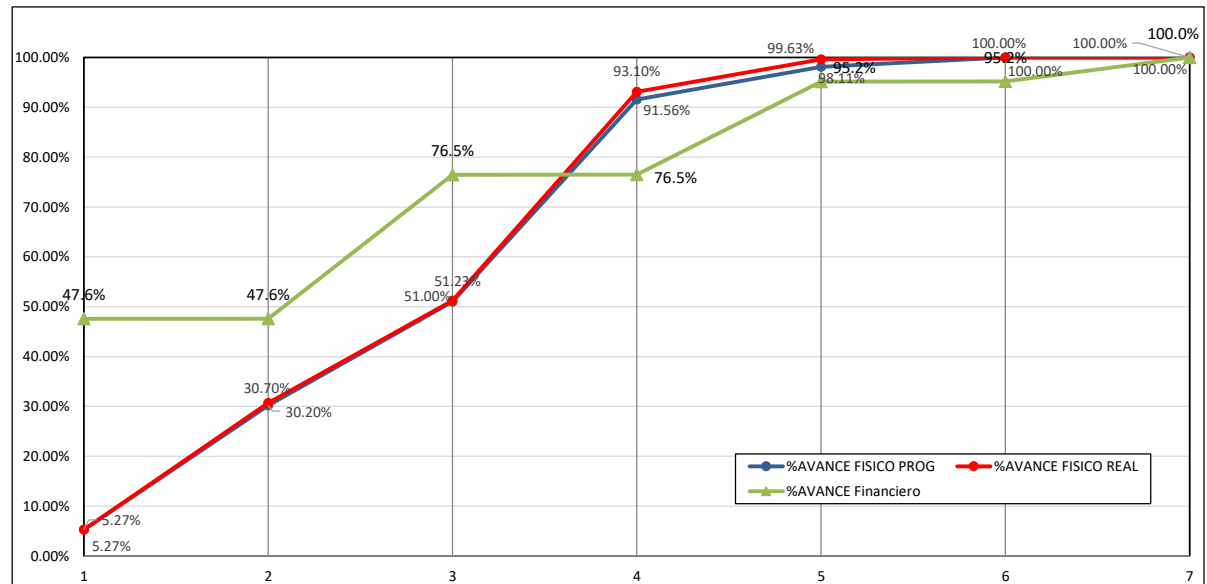

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
