


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PF24 004/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA EN LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN NORTE				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	PF24 004/2024		
Tipo de inversión:	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	Contratista:	MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		
Programa:	SF,SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN SD ALCANTARILLADO SC AGUA POTABLE	Inicio Vigente:	lunes, 12 de agosto de 2024	Días de Obra:	60
Subprograma:	01.03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	Inicio Real:	lunes, 12 de agosto de 2024	Monto Contratado:	\$1,679,759.97
Residente:	ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA	Fin Vigente:	jueves, 10 de octubre de 2024	Monto Ejercido:	\$1,679,759.97
		Fin Real:	jueves, 10 de octubre de 2024		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	10/08/2024	0.00%	0.00%	49.4%
2	19/08/2024	11.00%	11.18%	49.4%
3	26/08/2024	18.50%	18.79%	52.0%
4	02/09/2024	33.00%	33.34%	62.1%
5	09/09/2024	45.10%	45.97%	62.1%
6	16/09/2024	61.20%	61.48%	68.8%
7	23/09/2024	75.11%	75.81%	73.1%
8	30/09/2024	90.15%	90.97%	89.0%
9	07/10/2024	97.90%	98.04%	89.0%
10	14/10/2024	100.00%	100.00%	89.0%
11	21/10/2024	100.00%	100.00%	100.0%

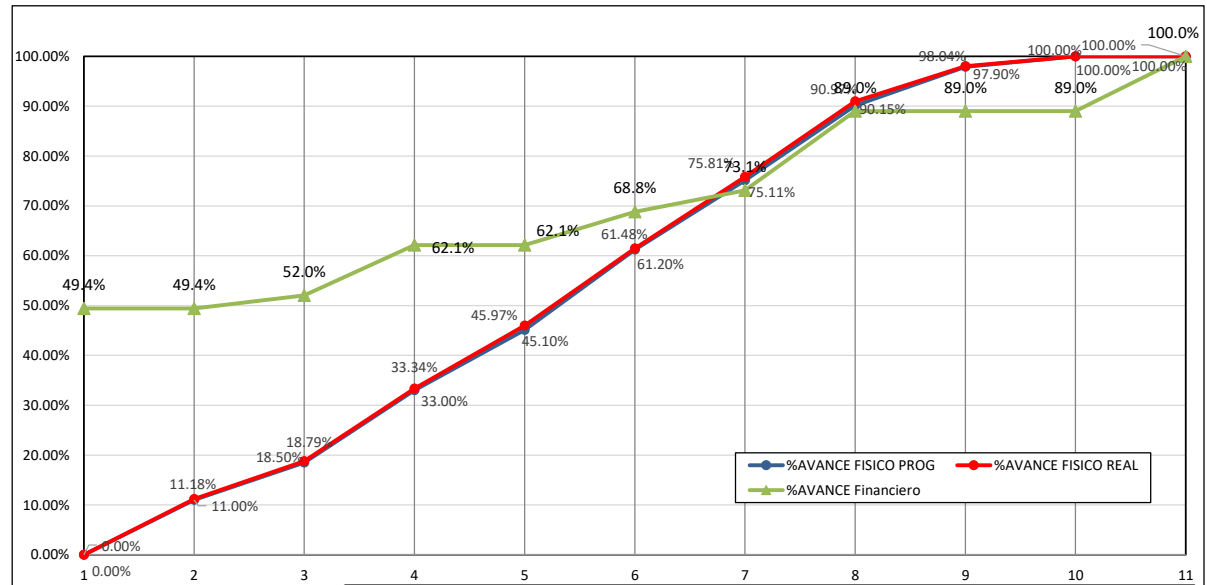

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
