


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

<b>Obra:</b>	PF24 005/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA EN LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN NORTE DE CALLE EMILIO CARRANZA A CALLE FCO. I MADERO		
<b>Ubicación:</b>	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Contrato:</b>	PF24 005/2024
<b>Tipo de inversión:</b>	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	<b>Contratista:</b>	MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
<b>Programa:</b>	SF,SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN SD ALCANTARILLADO SC AGUA POTABLE	<b>Inicio Vigente:</b>	viernes, 20 de diciembre de 2024
<b>Subprograma:</b>	01.03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	<b>Inicio Real:</b>	viernes, 20 de diciembre de 2024
<b>Residente:</b>	ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA	<b>Fin Vigente:</b>	lunes, 17 de febrero de 2025
		<b>Fin Real:</b>	lunes, 17 de febrero de 2025
		<b>Días de Obra:</b>	60
		<b>Monto Contratado:</b>	\$1,679,759.97
		<b>Monto Ejercido:</b>	\$1,679,759.97

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	27/12/2024	3.12%	3.65%	50.0%
2	03/01/2025	6.96%	6.99%	50.0%
3	10/01/2025	12.22%		
4	17/01/2025	21.22%		
5	24/01/2025	47.30%		
6	31/01/2025	68.64%		
7	07/02/2025	89.20%		
8	14/02/2025	97.82%		
9	21/02/2025	100.00%		
10	28/02/2025	100.00%		
11	07/03/2025	100.00%		

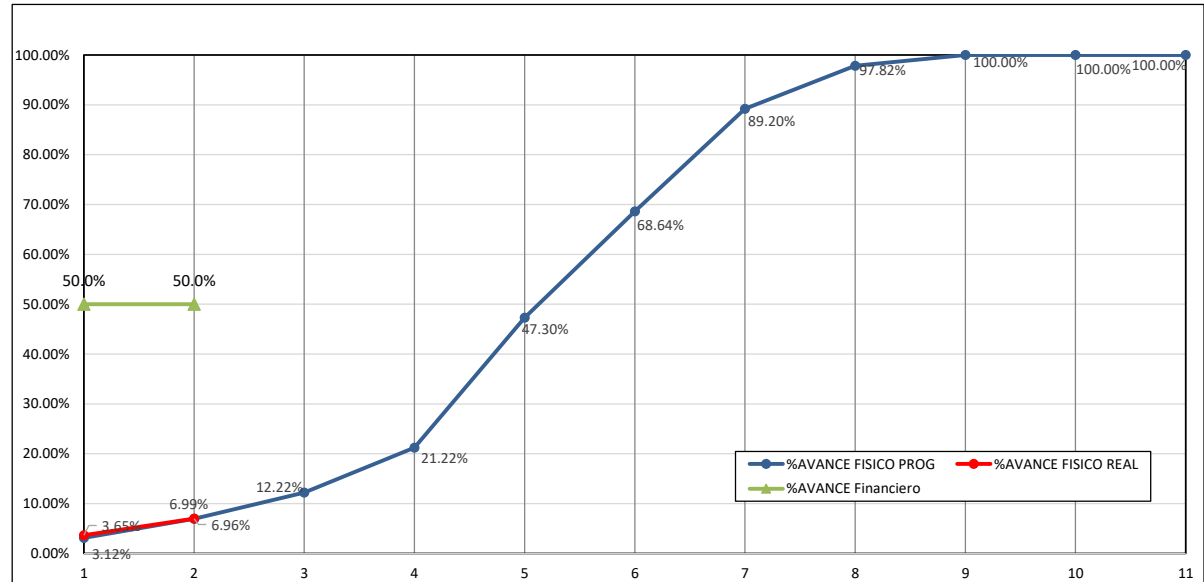

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
